


# 通学路合同点検対策箇所図（東雲小学校）



R2【NO. 1】 済

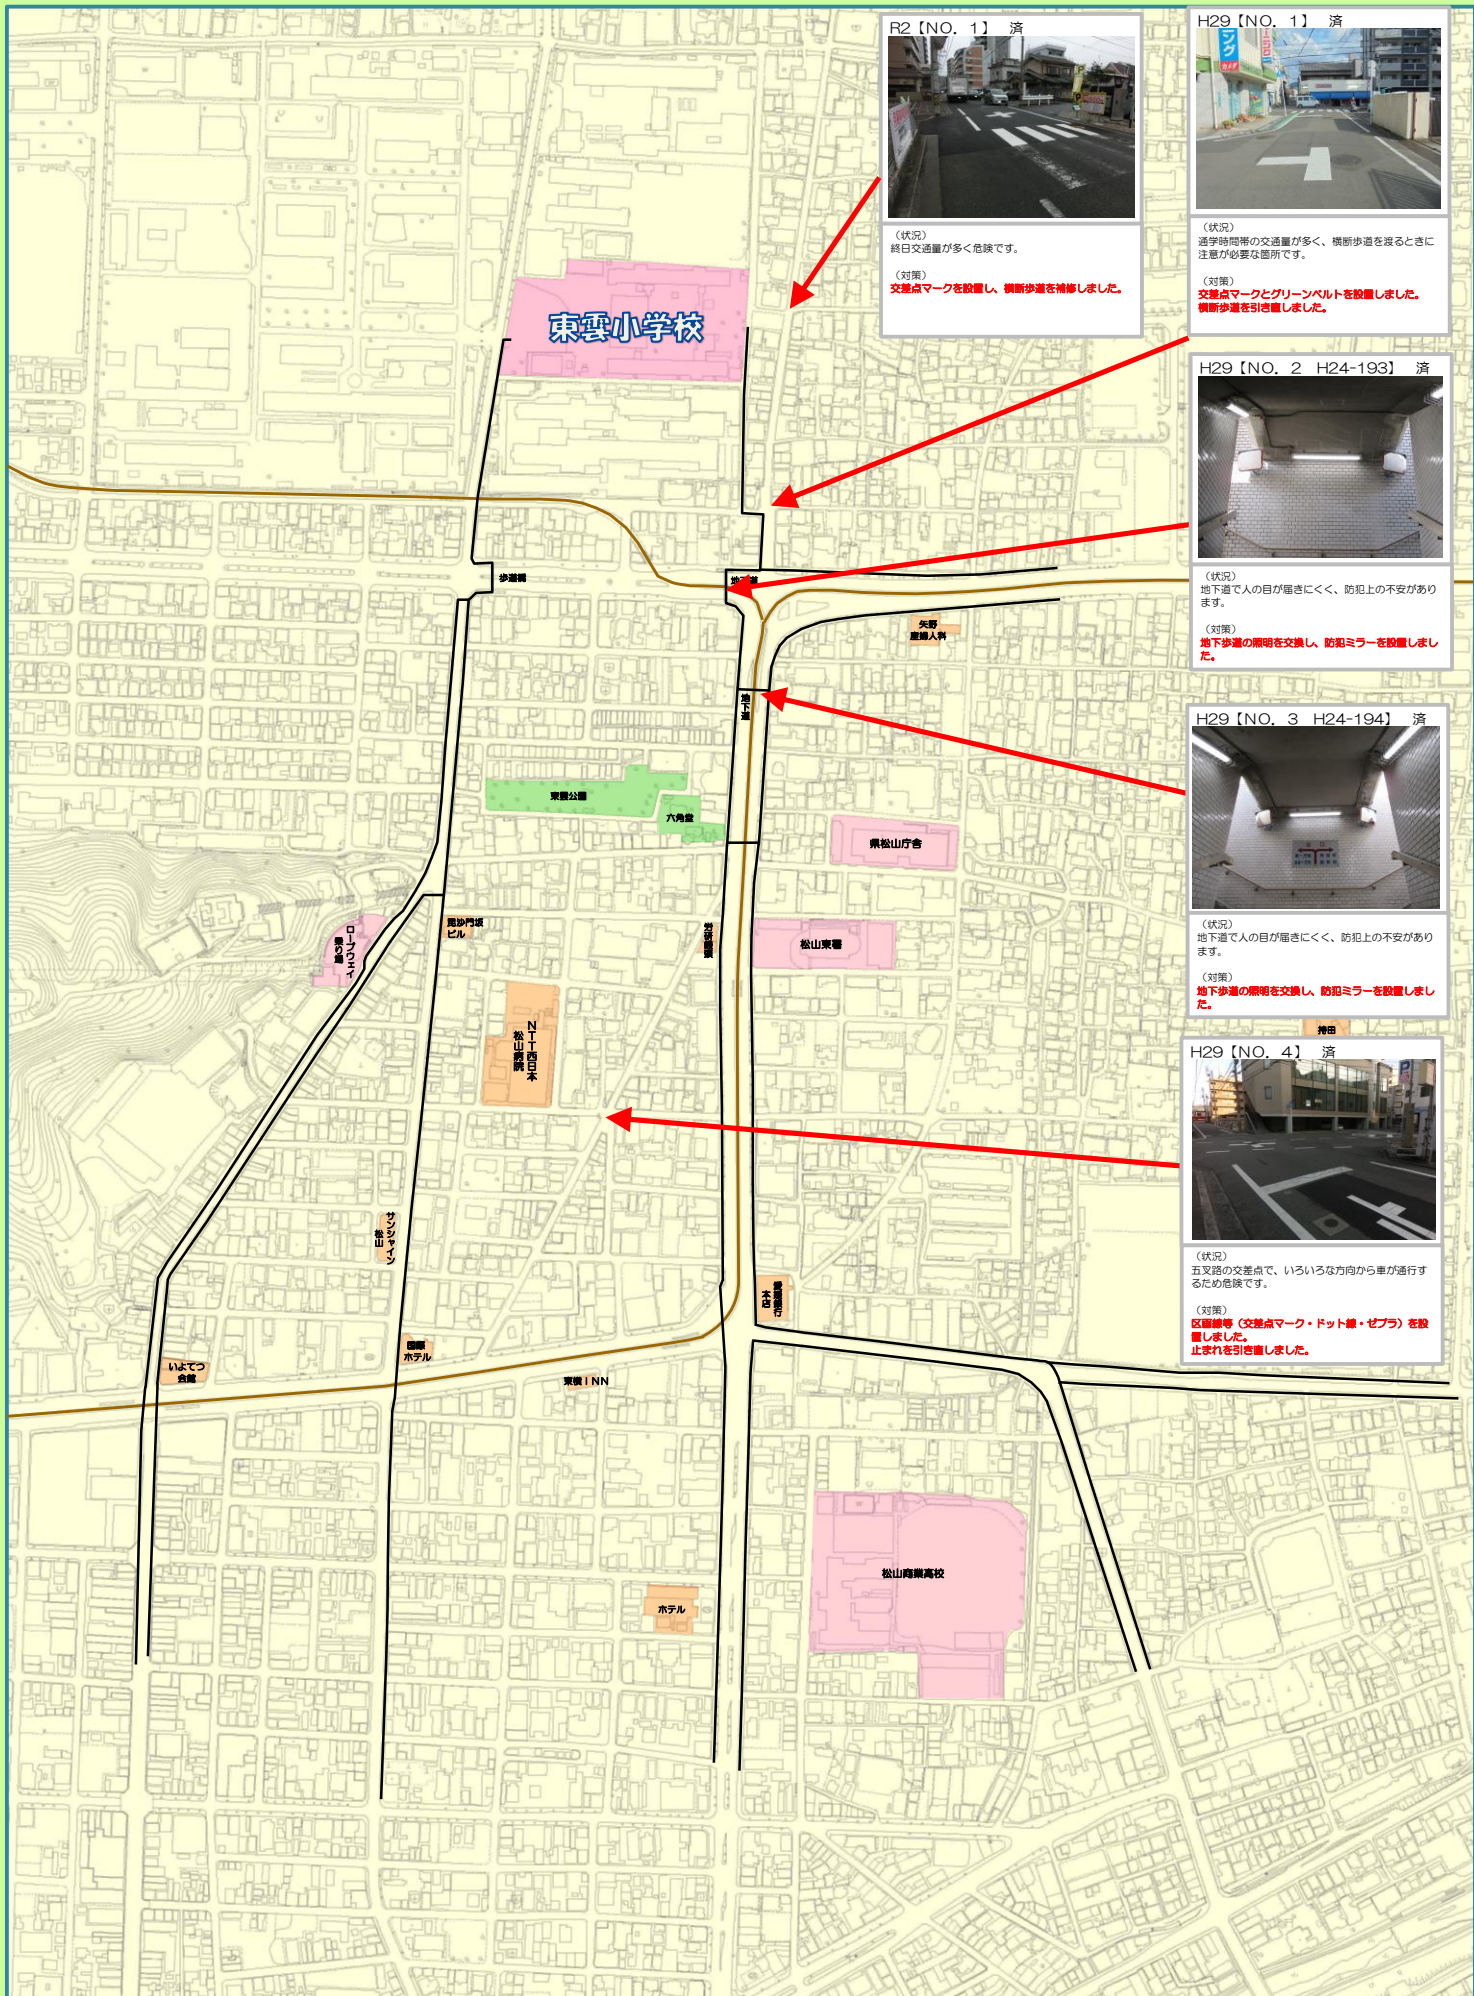

（状況）  
終日交通量が多く危険です。

（対策）  
交差点マークを設置し、横断歩道を補修しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）  
通学時間帯の交通量が多く、横断歩道を渡るときに注意が必要箇所です。

（対策）  
交差点マークとグリーンベルトを設置しました。横断歩道を引き直しました。

H29【NO. 2 H24-193】 済



（状況）  
地下道で人の目が届きにくく、防犯上の不安があります。

（対策）  
地下歩道の照明を交換し、防犯ミラーを設置しました。

H29【NO. 3 H24-194】 済



（状況）  
地下道で人の目が届きにくく、防犯上の不安があります。

（対策）  
地下歩道の照明を交換し、防犯ミラーを設置しました。

特記

H29【NO. 4】 済



（状況）  
五叉路の交差点で、いろいろな方向から車が通行するため危険です。

（対策）  
区画線等（交差点マーク・ドット線・ゼブラ）を設置しました。止まれを引直しました。
