


通学路合同点検対策箇所図（石井小学校）

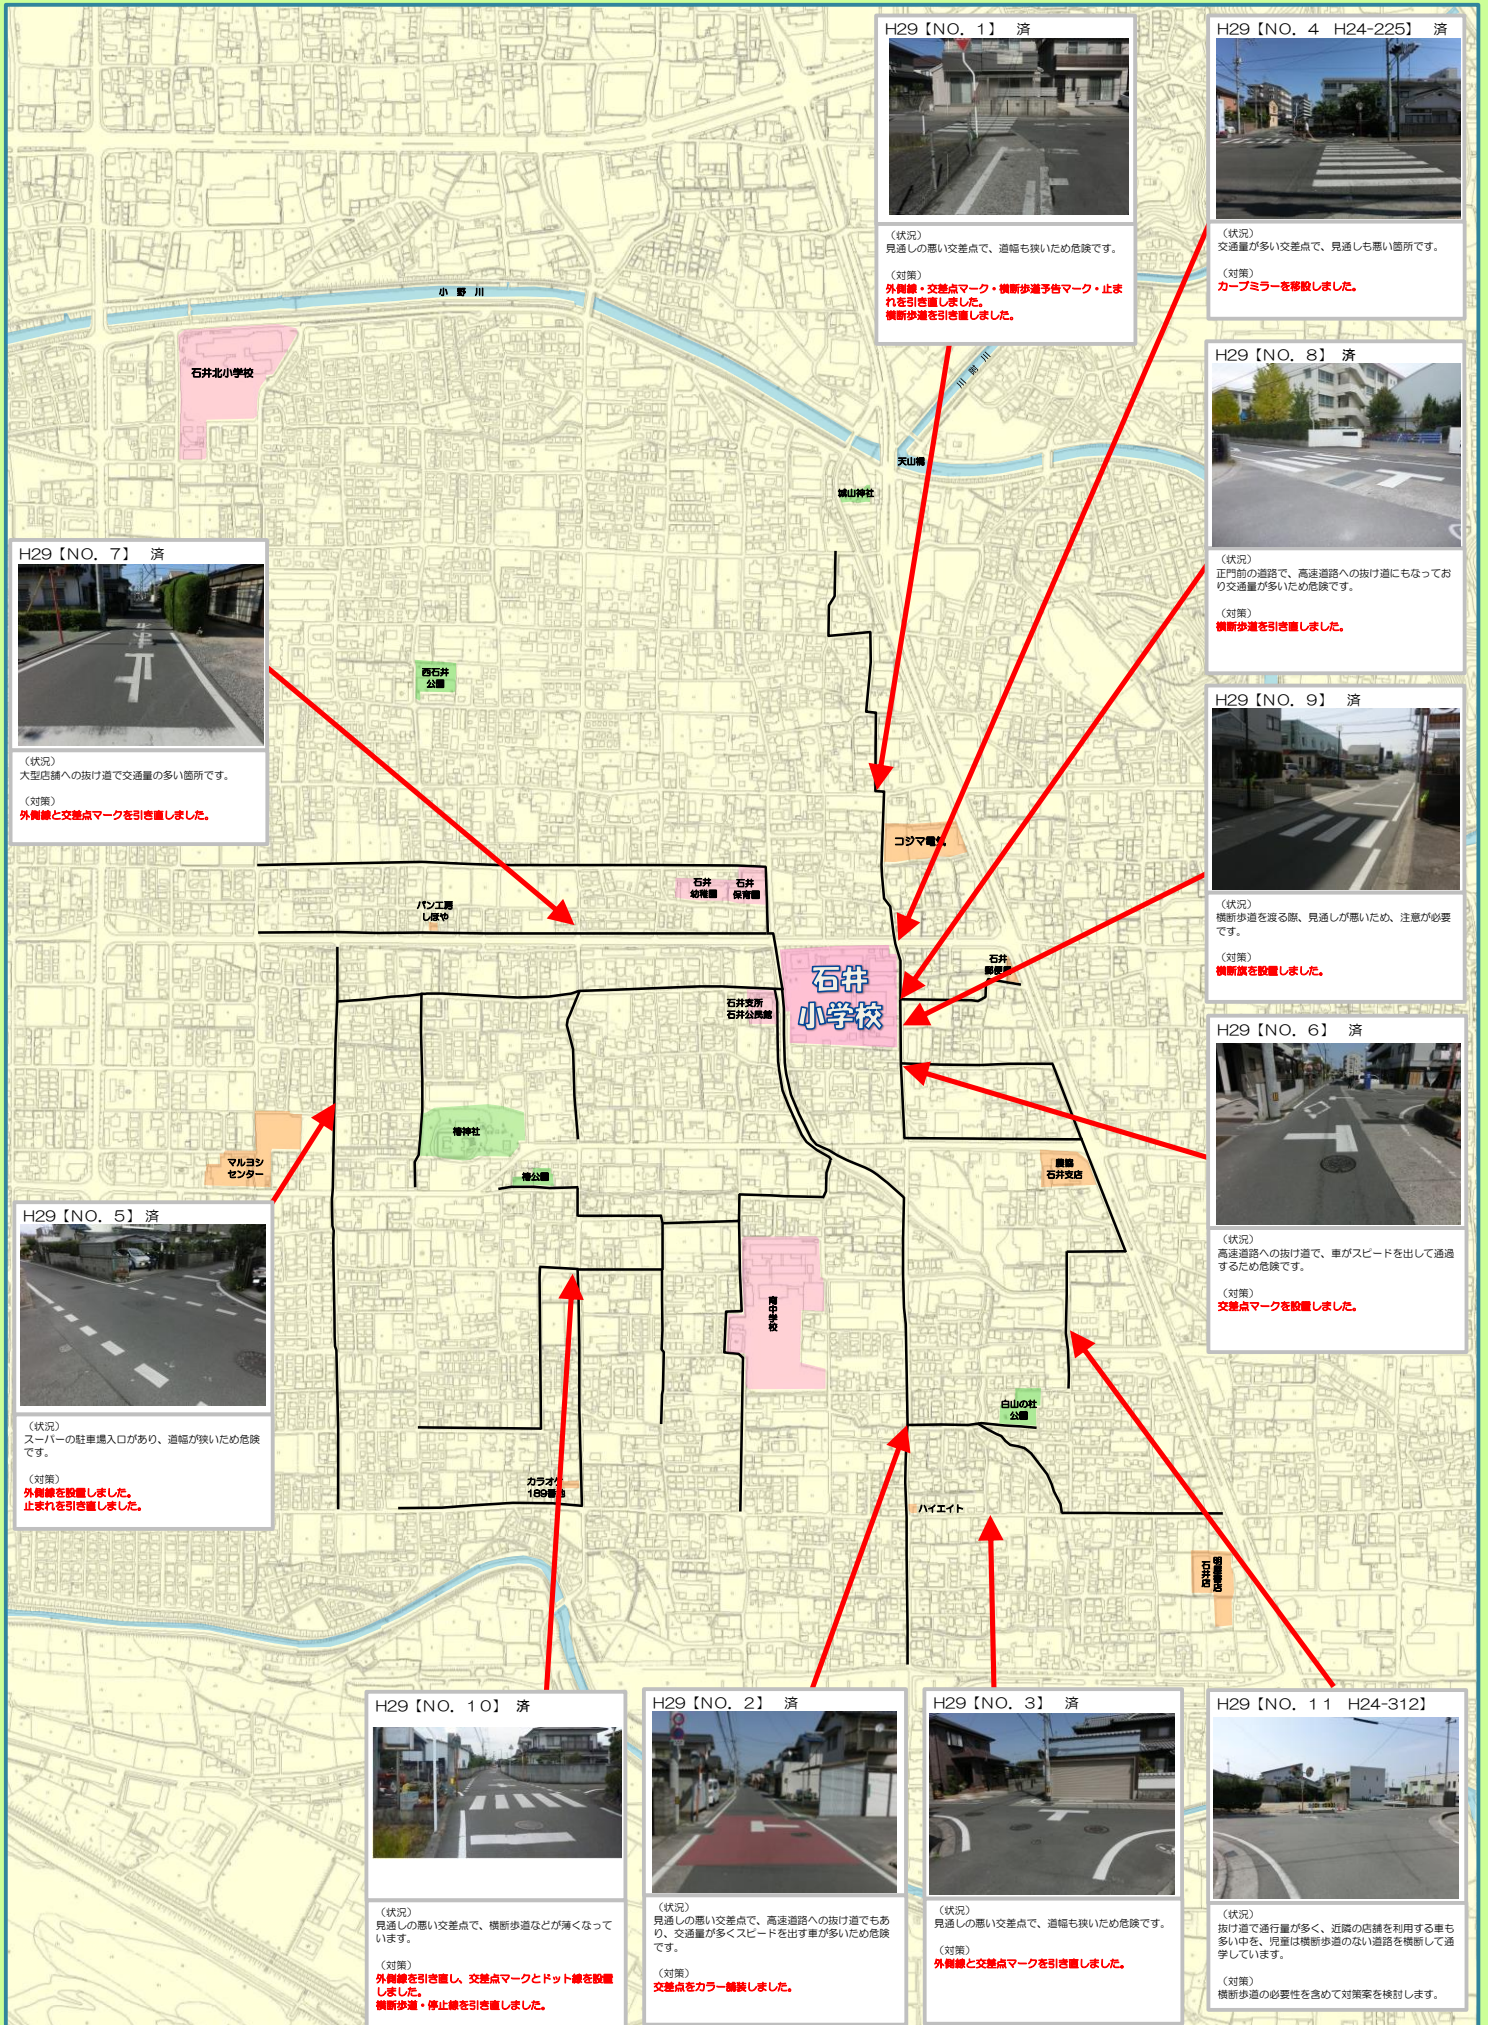

H29【NO. 1】 済

(状況) 見通しの悪い交差点で、道幅も狭いため危険です。

(対策) 外側線・交差点マーク・横断歩道予告マーク・止まれを引きました。横断歩道を引きました。

H29【NO. 4 H24-225】 済

(状況) 交通量が多い交差点で、見通しも悪い箇所です。

(対策) カーブミラーを移設しました。

H29【NO. 8】 済

(状況) 正門前の道路で、高速道路への抜け道にもなっており交通量が多いため危険です。

(対策) 横断歩道を引きました。

H29【NO. 9】 済

(状況) 横断歩道を渡る際、見通しが悪いので、注意が必要です。

(対策) 横断歩道を設置しました。

H29【NO. 6】 済

(状況) 高速道路への抜け道で、車がスピードを出して通過するため危険です。

(対策) 交差点マークを設置しました。

H29【NO. 7】 済

(状況) 大型店舗への抜け道で交通量の多い箇所です。

(対策) 外側線と交差点マークを引きました。

H29【NO. 5】 済

(状況) スーパーの駐車場入口があり、道幅が狭いため危険です。

(対策) 外側線を設置しました。止まれを引きました。

H29【NO. 10】 済

(状況) 見通しの悪い交差点で、横断歩道などが狭くなっています。

(対策) 外側線を引直し、交差点マークとドット線を設置しました。横断歩道・停止線を引きました。

H29【NO. 2】 済

(状況) 見通しの悪い交差点で、高速道路への抜け道でもあり、交通量が多くスピードを出す車が多いため危険です。

(対策) 交差点をカラー舗装しました。

H29【NO. 3】 済

(状況) 見通しの悪い交差点で、道幅も狭いため危険です。

(対策) 外側線と交差点マークを引きました。

H29【NO. 11 H24-312】

(状況) 抜け道で通行量が多く、近隣の店舗を利用する車も多いため、児童は横断歩道のない道路を横断して通学しています。

(対策) 横断歩道の必要性を含めて対策案を検討します。
