


通学路合同点検対策箇所図（双葉小学校）

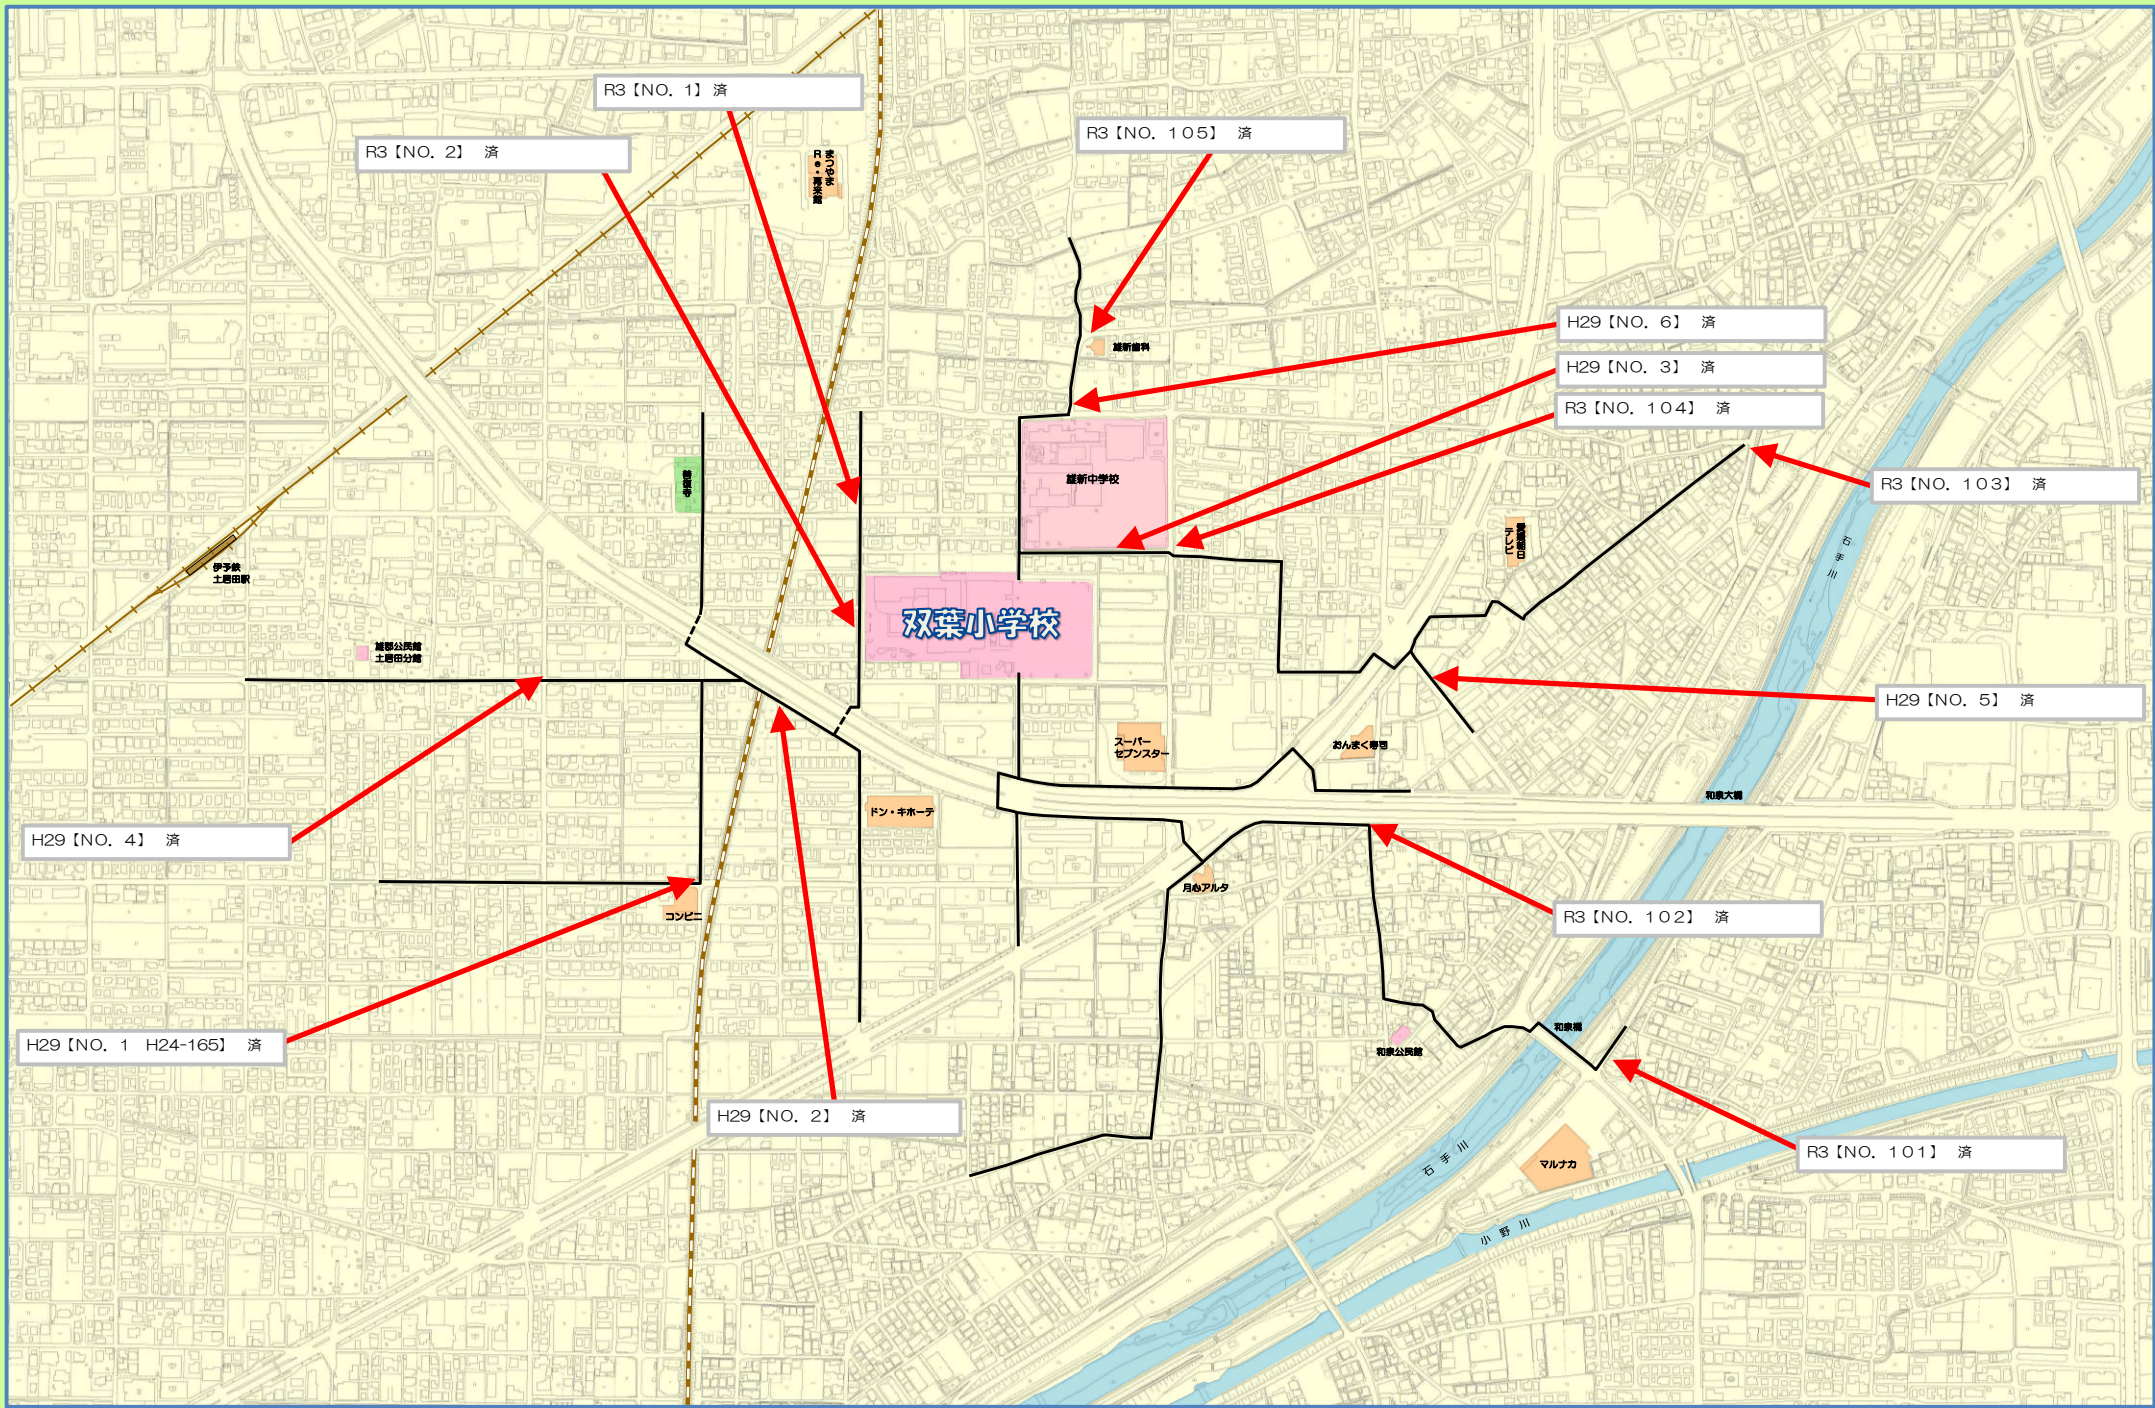

H29年度

H29【NO. 1 H24-165】 済	H29【NO. 2】 済	H29【NO. 3】 済	H29【NO. 4】 済	H29【NO. 5】 済	H29【NO. 6】 済	R3【NO. 1】 済	R3【NO. 2】 済
							
<p>〔状況〕 交通量の多い交差点で注意が必要です。</p> <p>〔対策〕 交差点マークとドット線を設置し、止まれを引直しました。</p>	<p>〔状況〕 歩道橋を下りた際、外側線がないため注意が必要です。</p> <p>〔対策〕 外側線を設置しました。</p>	<p>〔状況〕 水路のある道路で、落下する危険があります。</p> <p>〔対策〕 崖下段とも水路の反対側を通るよう通学ルートを変更しました。グリーンベルト（水路の反対側）を設置しました。</p>	<p>〔状況〕 道幅が狭く交通量が多い交差点で、スピードも出した車も通行するため危険です。</p> <p>〔対策〕 交差点マークとドット線を設置しました。停止線・止まれ・横断歩道を引直しました。</p>	<p>〔状況〕 三叉路の交差点で、横断歩道など薄くなっています。</p> <p>〔対策〕 外側線・横断歩道・停止線を引直しました。</p>	<p>〔状況〕 外側線や横断歩道が薄くなっています。</p> <p>〔対策〕 外側線と横断歩道を引直しました。</p>	<p>〔状況〕 見通しが悪く、事故が多発しています。</p> <p>〔対策〕 道路を補修し、交差点マークを引直しました。横断歩道と東西に一時停止を設置しました。</p>	<p>〔状況〕 横断歩道や外側線が薄くなっています。</p> <p>〔対策〕 道路を補修し、横断歩道・外側線を引直しました。</p>

R3年度

R3年度

R3【NO. 101】 済	R3【NO. 102】 済	R3【NO. 103】 済	R3【NO. 104】 済	R3【NO. 105】 済
				
<p>〔状況〕 土手を上がったところから、道幅が狭くなっています。</p> <p>〔対策〕 グリーンベルトを設置しました。</p>	<p>〔状況〕 側道に入る車がいて危険です。</p> <p>〔対策〕 減速マークを設置しました。停止線を引直しました。</p>	<p>〔状況〕 交通量が多いです。</p> <p>〔対策〕 交差点マークを設置しました。</p>	<p>〔状況〕 横断歩道が薄えています。</p> <p>〔対策〕 横断歩道を補修しました。</p>	<p>〔状況〕 スピードを出す車が多く、曲がる際に歩行者を巻き込みそうです。</p> <p>〔対策〕 減速マークを設置しました。</p>
