


松山市緑町土砂災害の概要

現場の状況

- 雨量:225.0mm(7/10 23:00~7/13 13:00)
- 発災:7/12 3:49 土砂崩れの通報
- 住家の被害状況:【全壊】3棟 【半壊】2棟

復旧状況と今後の取組【令和7年4月21日時点】

- ①流出土砂撤去(松山市:完了)
- ②倒壊家屋解体撤去(松山市:完了)
- ③応急復旧工事(愛媛県:大型土のう設置完了)
- ④法面応急復旧工事(松山市:完了)
- ⑤法面本復旧工事(松山市:実施中)
- ⑥急傾斜地崩壊防止施設復旧工事(愛媛県:実施中)

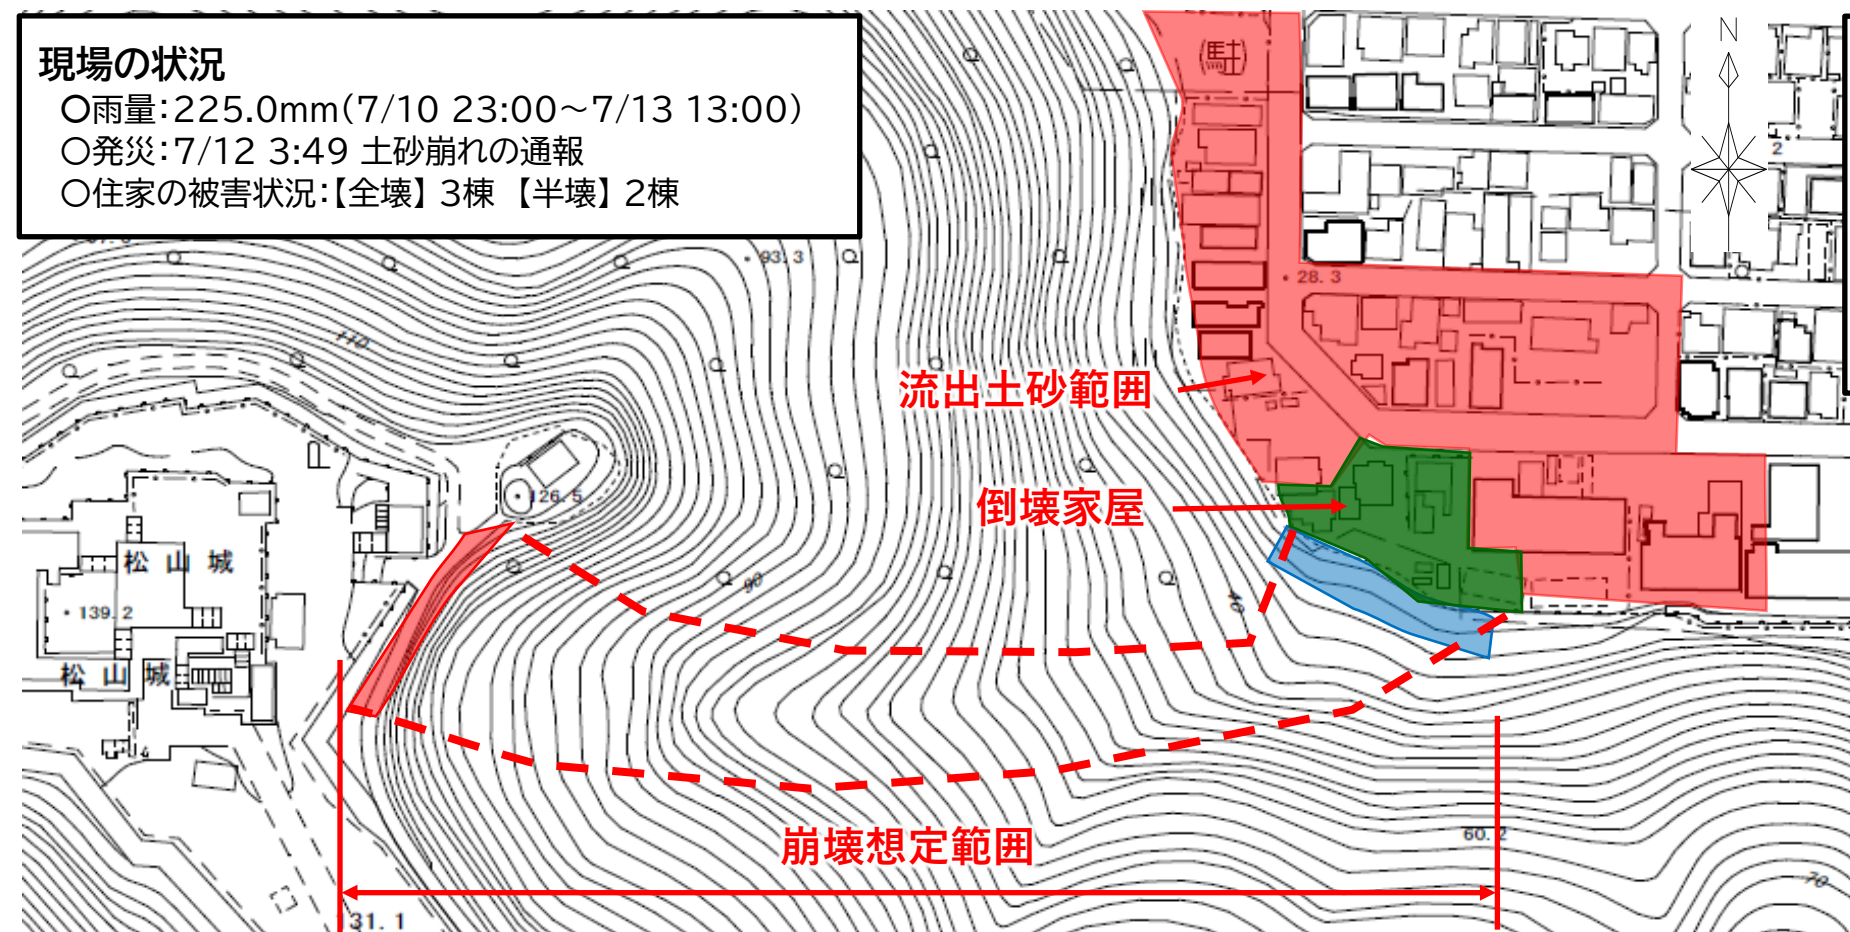

(参考)

第1回 松山市緑町土砂災害対策技術検討委員会の概要 (日時: 7月29日(月) 9:30~12:00)

関連資料の説明及び、委員や報道機関等が現場(緑町、城山)の被災状況を確認した。

【委員長】愛媛大学 森脇教授 (委員) 学識経験者(愛大)、国交省、愛媛県、松山市

- (1) 緊急車両用道路の工事内容や、松山城跡の雨水排水状況について
- (2) 土砂崩れした法面の変状記録について

第2回 松山市緑町土砂災害対策技術検討委員会の概要 (日時: 9月2日(月) 13:30~16:00)

- (1) 斜面崩壊に対する緊急車両用道路の影響について検証すべき
- (2) 降雨による水の流れ、立木(位置、高さ)の状況、捨土の分布について更なる整理のこと
- (3) 今回の降雨規模で斜面崩壊が発生した理由や、複数回の崩壊が生じた事象について可能な限り整理すること

第3回 松山市緑町土砂災害対策技術検討委員会の概要 (日時: 10月11日(金) 14:00~17:00)

- (1) 発生メカニズムについて、3つのプロセス、①斜面変形⇒②土砂流出⇒③土砂流下を経て発生したものと推定
- (2) 素因・誘因について検討状況を確認
- (3) 緊急車両用道路の影響について
- (4) 次回では、土質試験や浸透流解析を踏まえて発生メカニズムをとりまとめる

第4回 松山市緑町土砂災害対策技術検討委員会の概要 (日時: 12月23日(月) 14:00~16:20)

- (1) 土砂流出の発生機構と素因・誘因について
- (2) 本復旧対策について
- (3) 再発防止に向けた取組みについて

第5回 松山市緑町土砂災害対策技術検討委員会の概要 (日時: 1月30日(木) 10:00~11:00)

- (1) 松山市緑町土砂災害対策技術検討委員会のまとめについて
