


通学路合同点検対策箇所図（久枝小学校）



H29年度

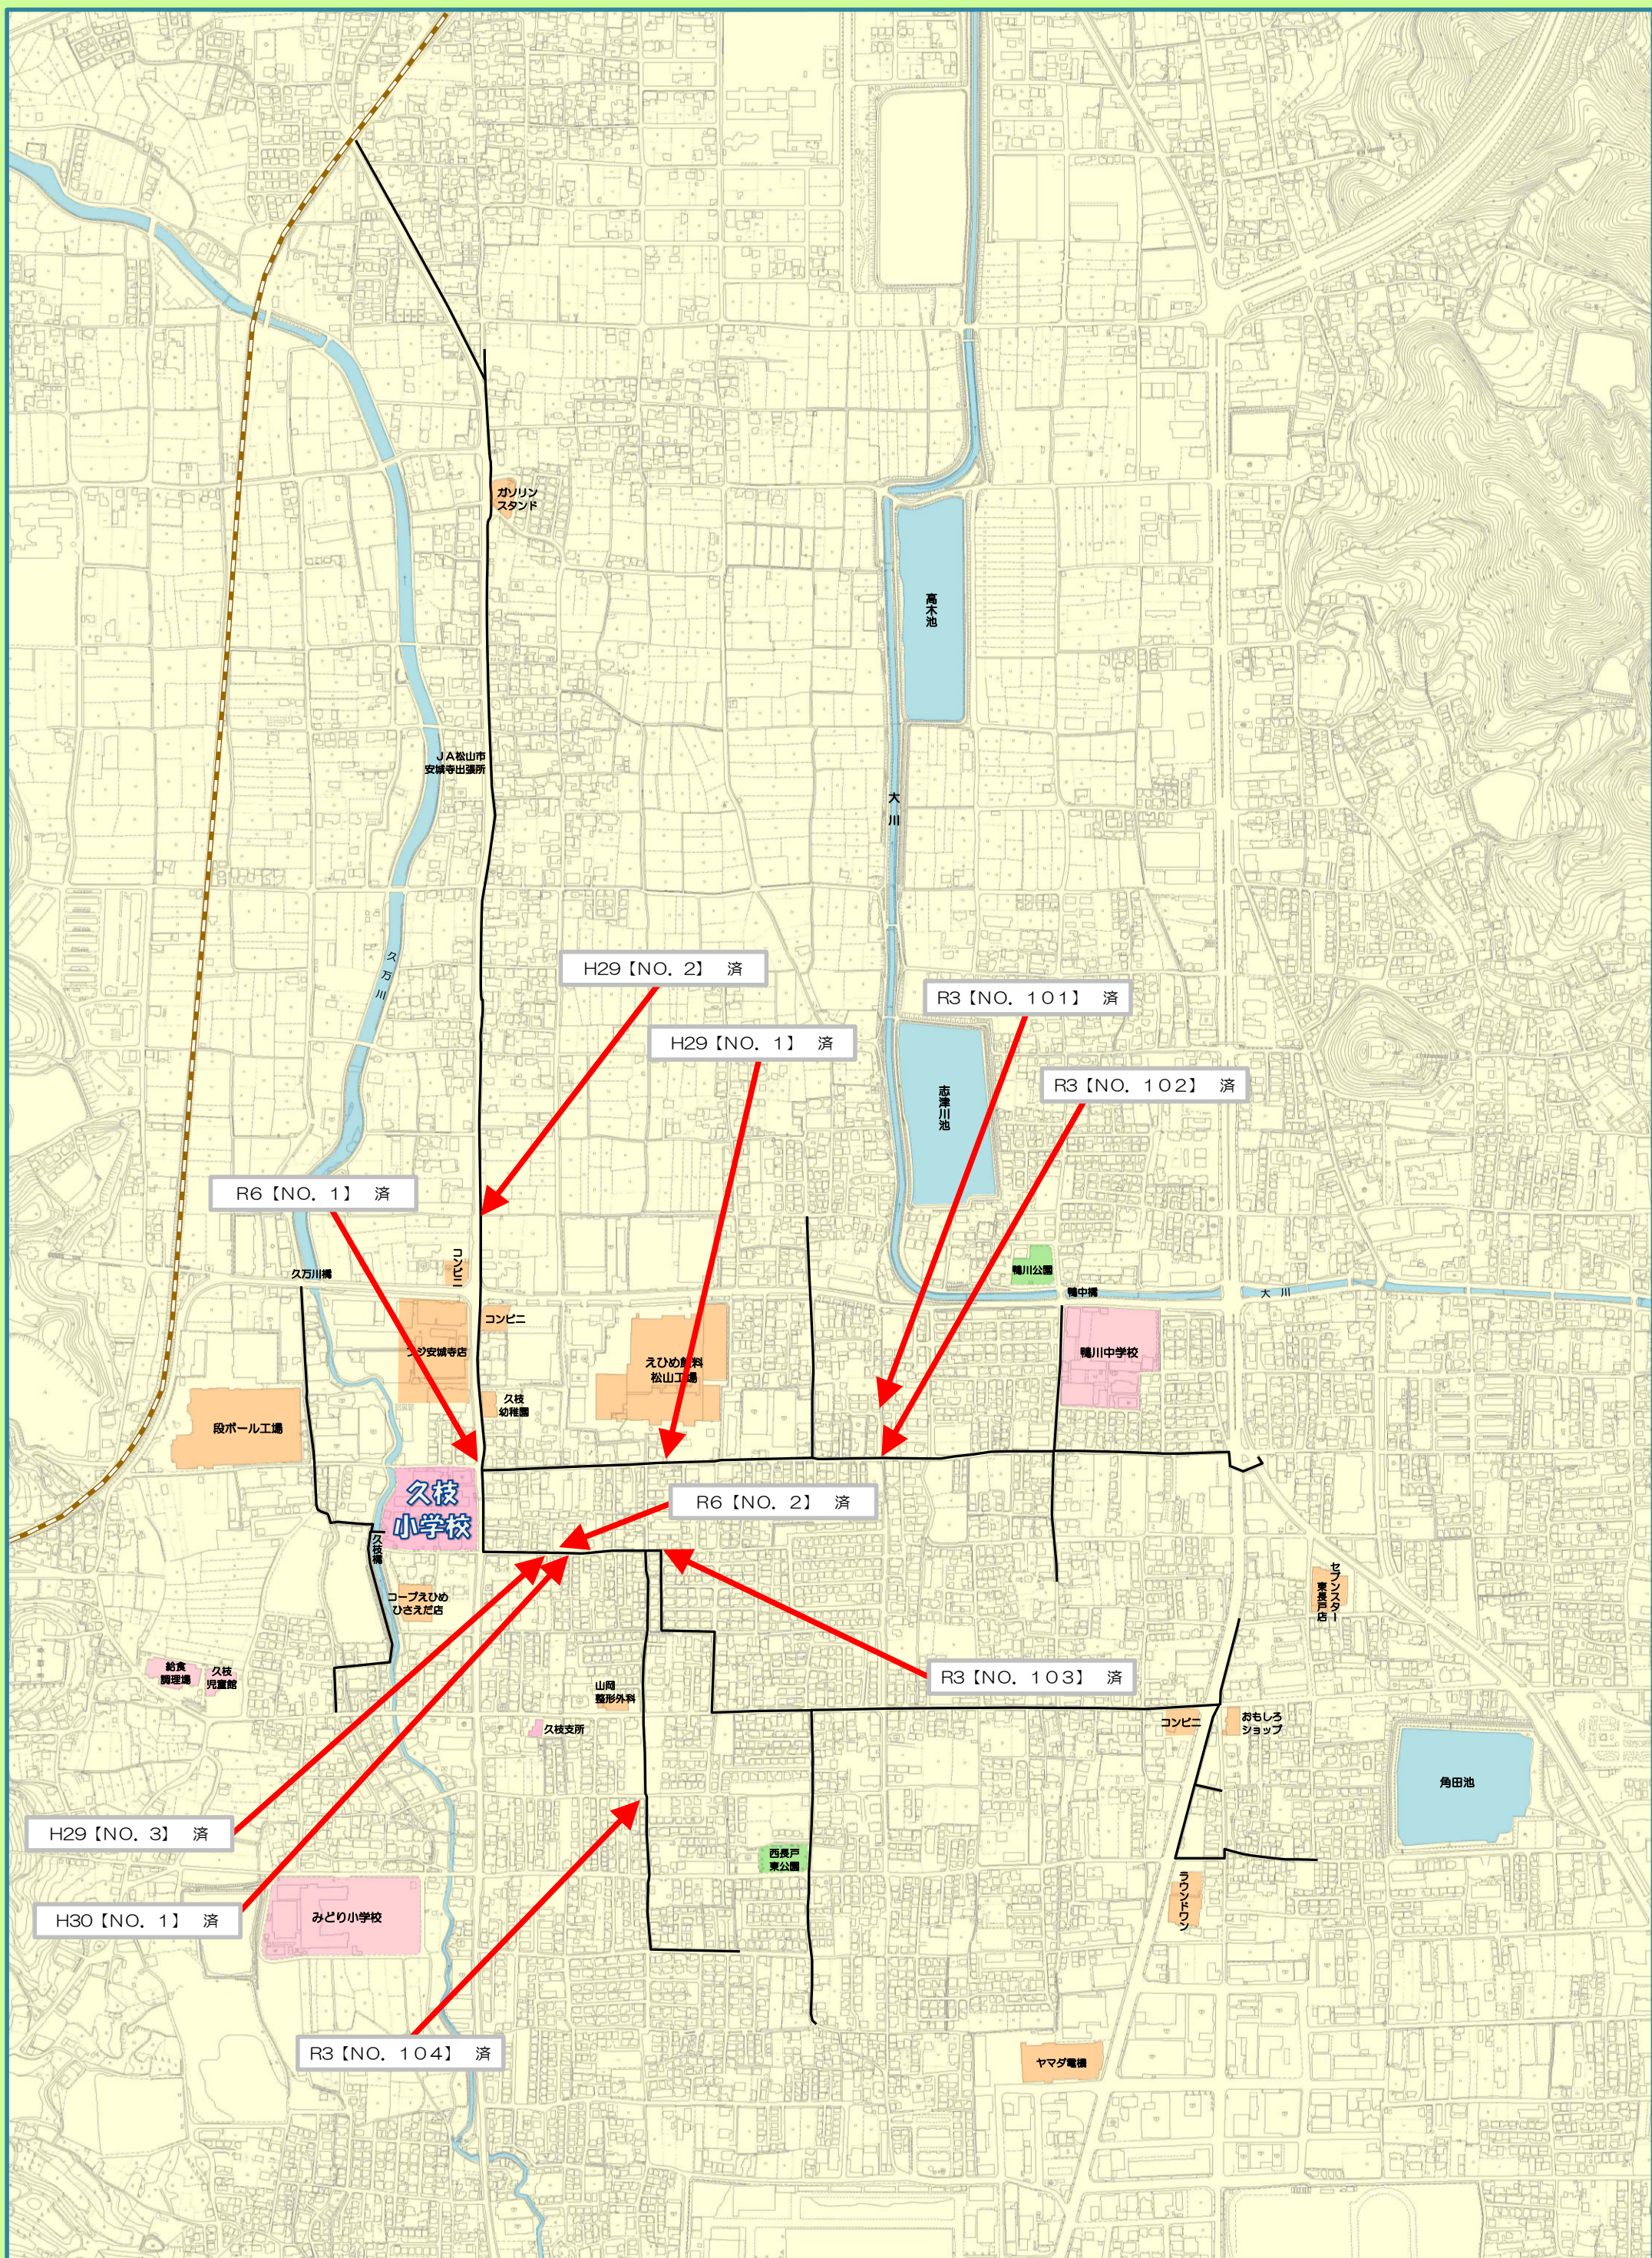

(状況)
一部、柵のない水路があり、落下する危険があります。

(対策)
ガードパイプを設置しました。



(状況)
通学・通勤の自転車が多く、接触する危険があります。

(対策)
外側線を引き直しました。



(状況)
脇道から大きい道路へ出る場所で、自動車や自転車の交通量が多い箇所です。

(対策)
グリーンベルトを延長して設置しました。

H30年度



(状況)
脇道から大きい道路へ出る場所で、自動車や自転車の交通量が多い箇所です。

(対策)
グリーンベルトを延長して設置しました。

R3年度



(状況)
道幅が狭く、舗装がされていないです。

(対策)
町内会からの要望を踏まえ舗装しました。

R3【NO. 102】 済



(状況)
道路横に水路があり、ガードパイプ等がないです。

(対策)
地域と関係団体の協議に基づき、デリネーターを設置しました。

R3【NO. 103】 済



(状況)
見通しが悪いです。

(対策)
交差点マークを設置しました。

R3【NO. 104】 済



(状況)
道幅が狭く、草が茂っています。

(対策)
草を刈りました。

R6【NO. 1】 済



(状況)
道幅が狭く歩道もないが、交通量が多いです。

(対策)
路面に通学路の標示を設置しました。

R6【NO. 2】 済



(状況)
交通量が多く、また、大雨のとき水路が見えなくなることがあります。

(対策)
交差点マークと路面に通学路の標示を設置しました。登下校とも右側通行とのことだったので、今後は登下校とも既に設置しているグリーンベルト側を歩くこととしました。

R6年度
