


通学路合同点検対策箇所図（湯山小学校）



H29年度

H29【NO. 1】 済

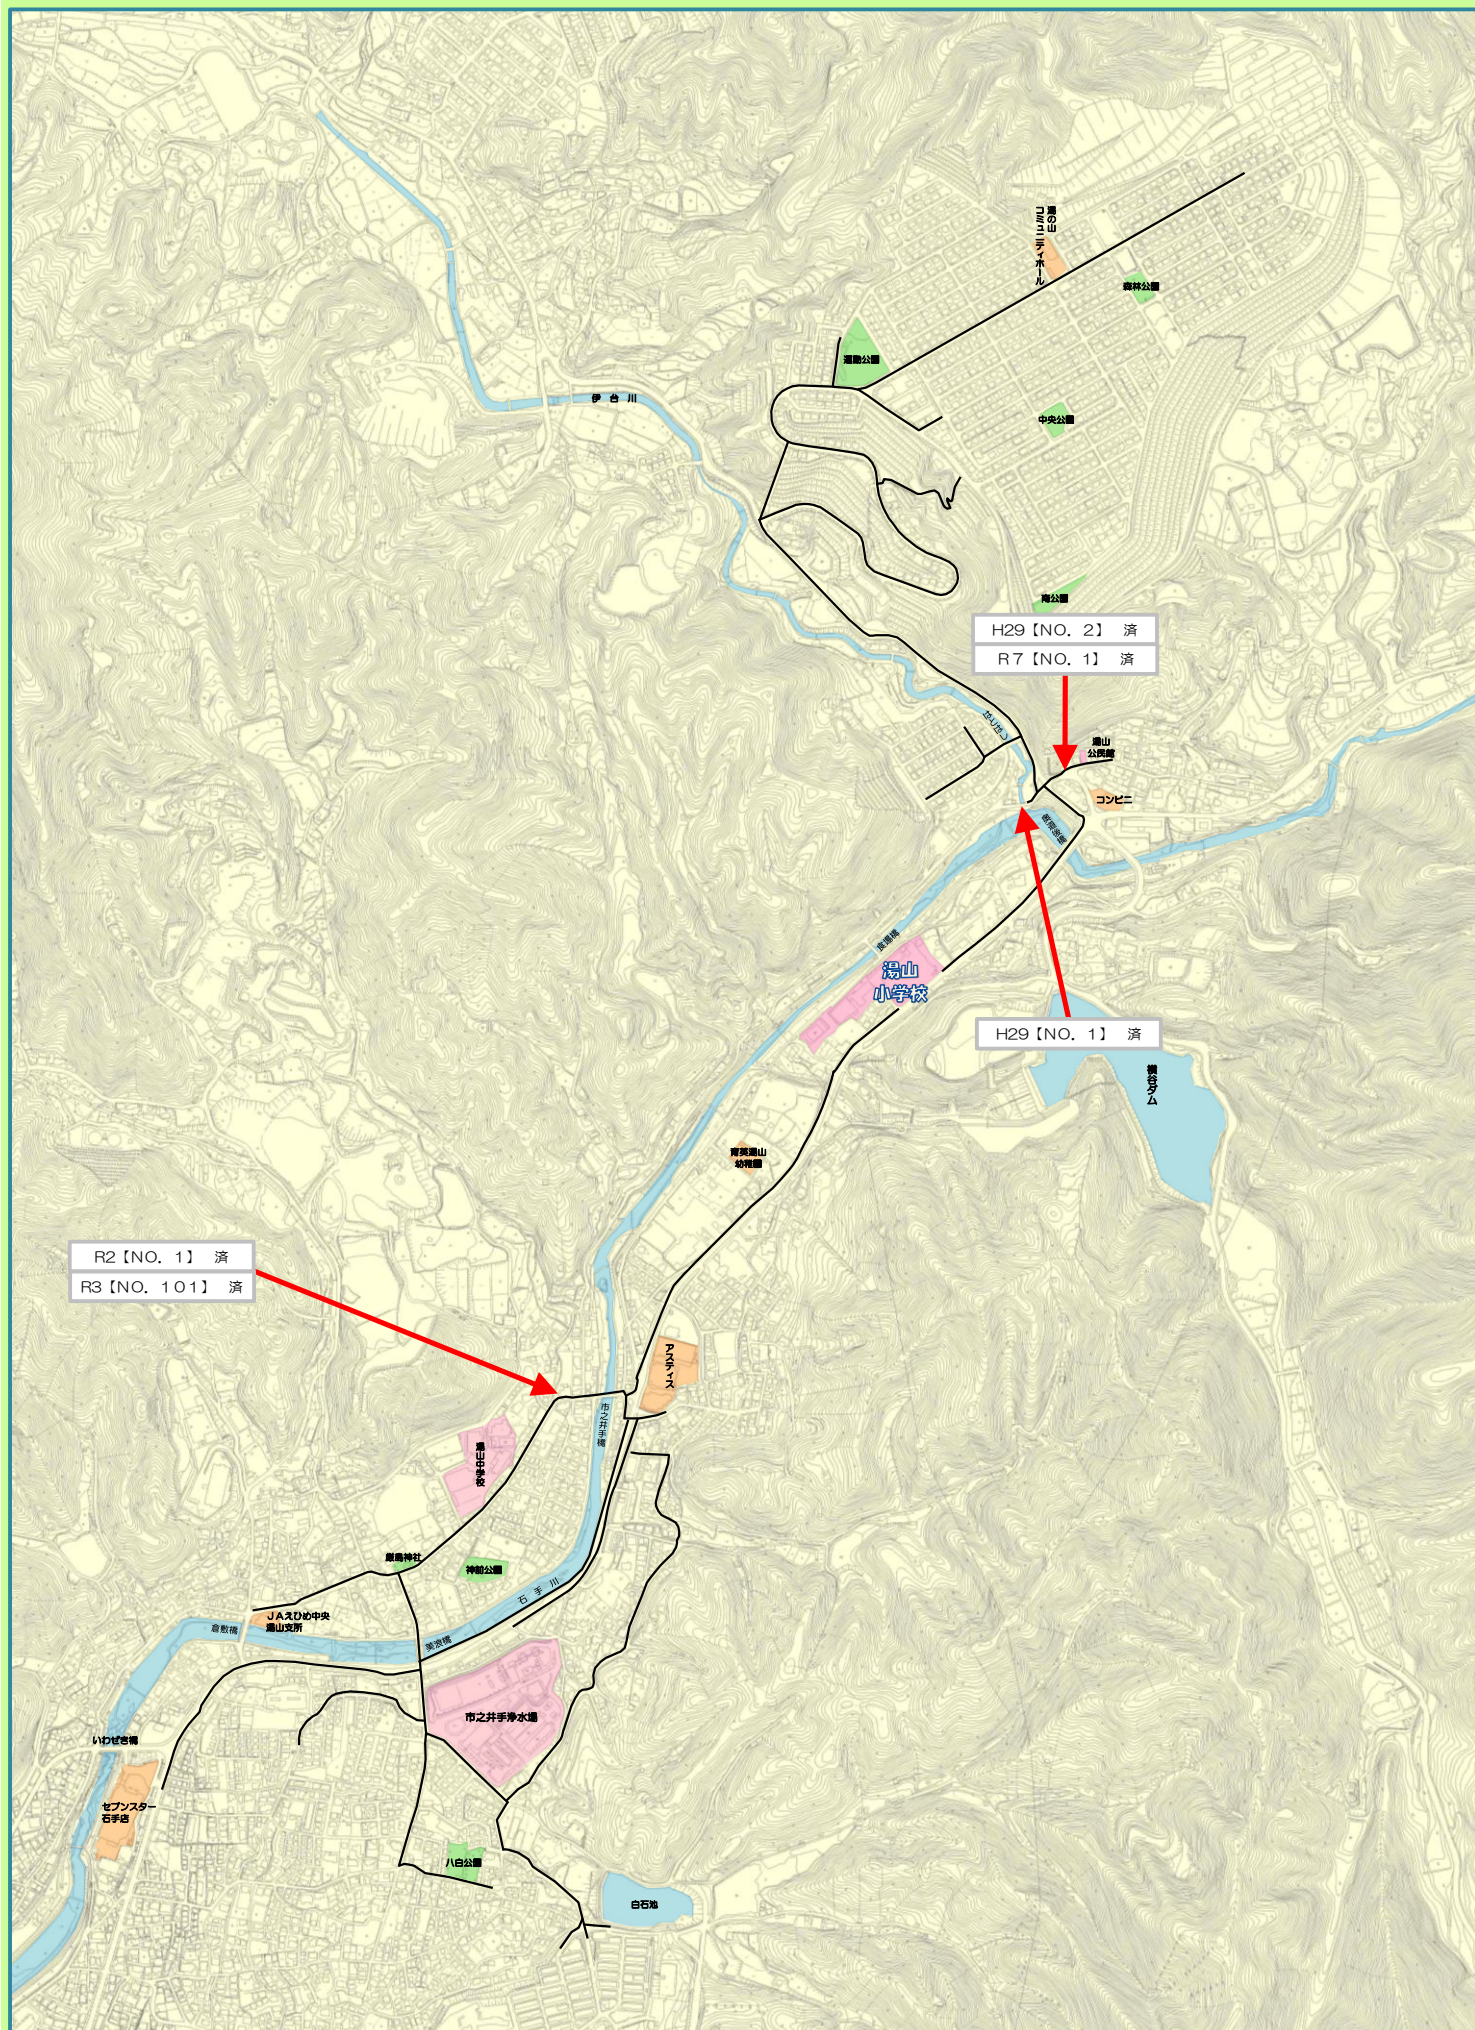

（状況）
車や自転車がスピードを出して通ることがあり、危険です。

（対策）
減速マークを設置し、外側線を引き直しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）
抜け道で利用する車が通る箇所で、外側線が途中からないため注意が必要です。

（対策）
外側線を設置しました。

R2年度

R2【NO. 1】 済



（状況）
道幅が狭く、速度を出している車が多いです。

（対策）
外側線の設置と補修、減速マーク及びT字マーク、30キロ規制の路面標示を設置しました。



R3年度

R3【NO. 101】 済



（状況）
合流する道の見通しが悪いです。

（対策）
カーブミラーを設置しました。

R7年度

R7【NO. 1】 済



（状況）
抜け道として利用する車が多いです。

（対策）
県道については外側線を引き直し、市道については交差点マークの設置と路側帯を拡張して外側線を引き直しました。
