


通学路合同点検対策箇所図（北久米小学校）

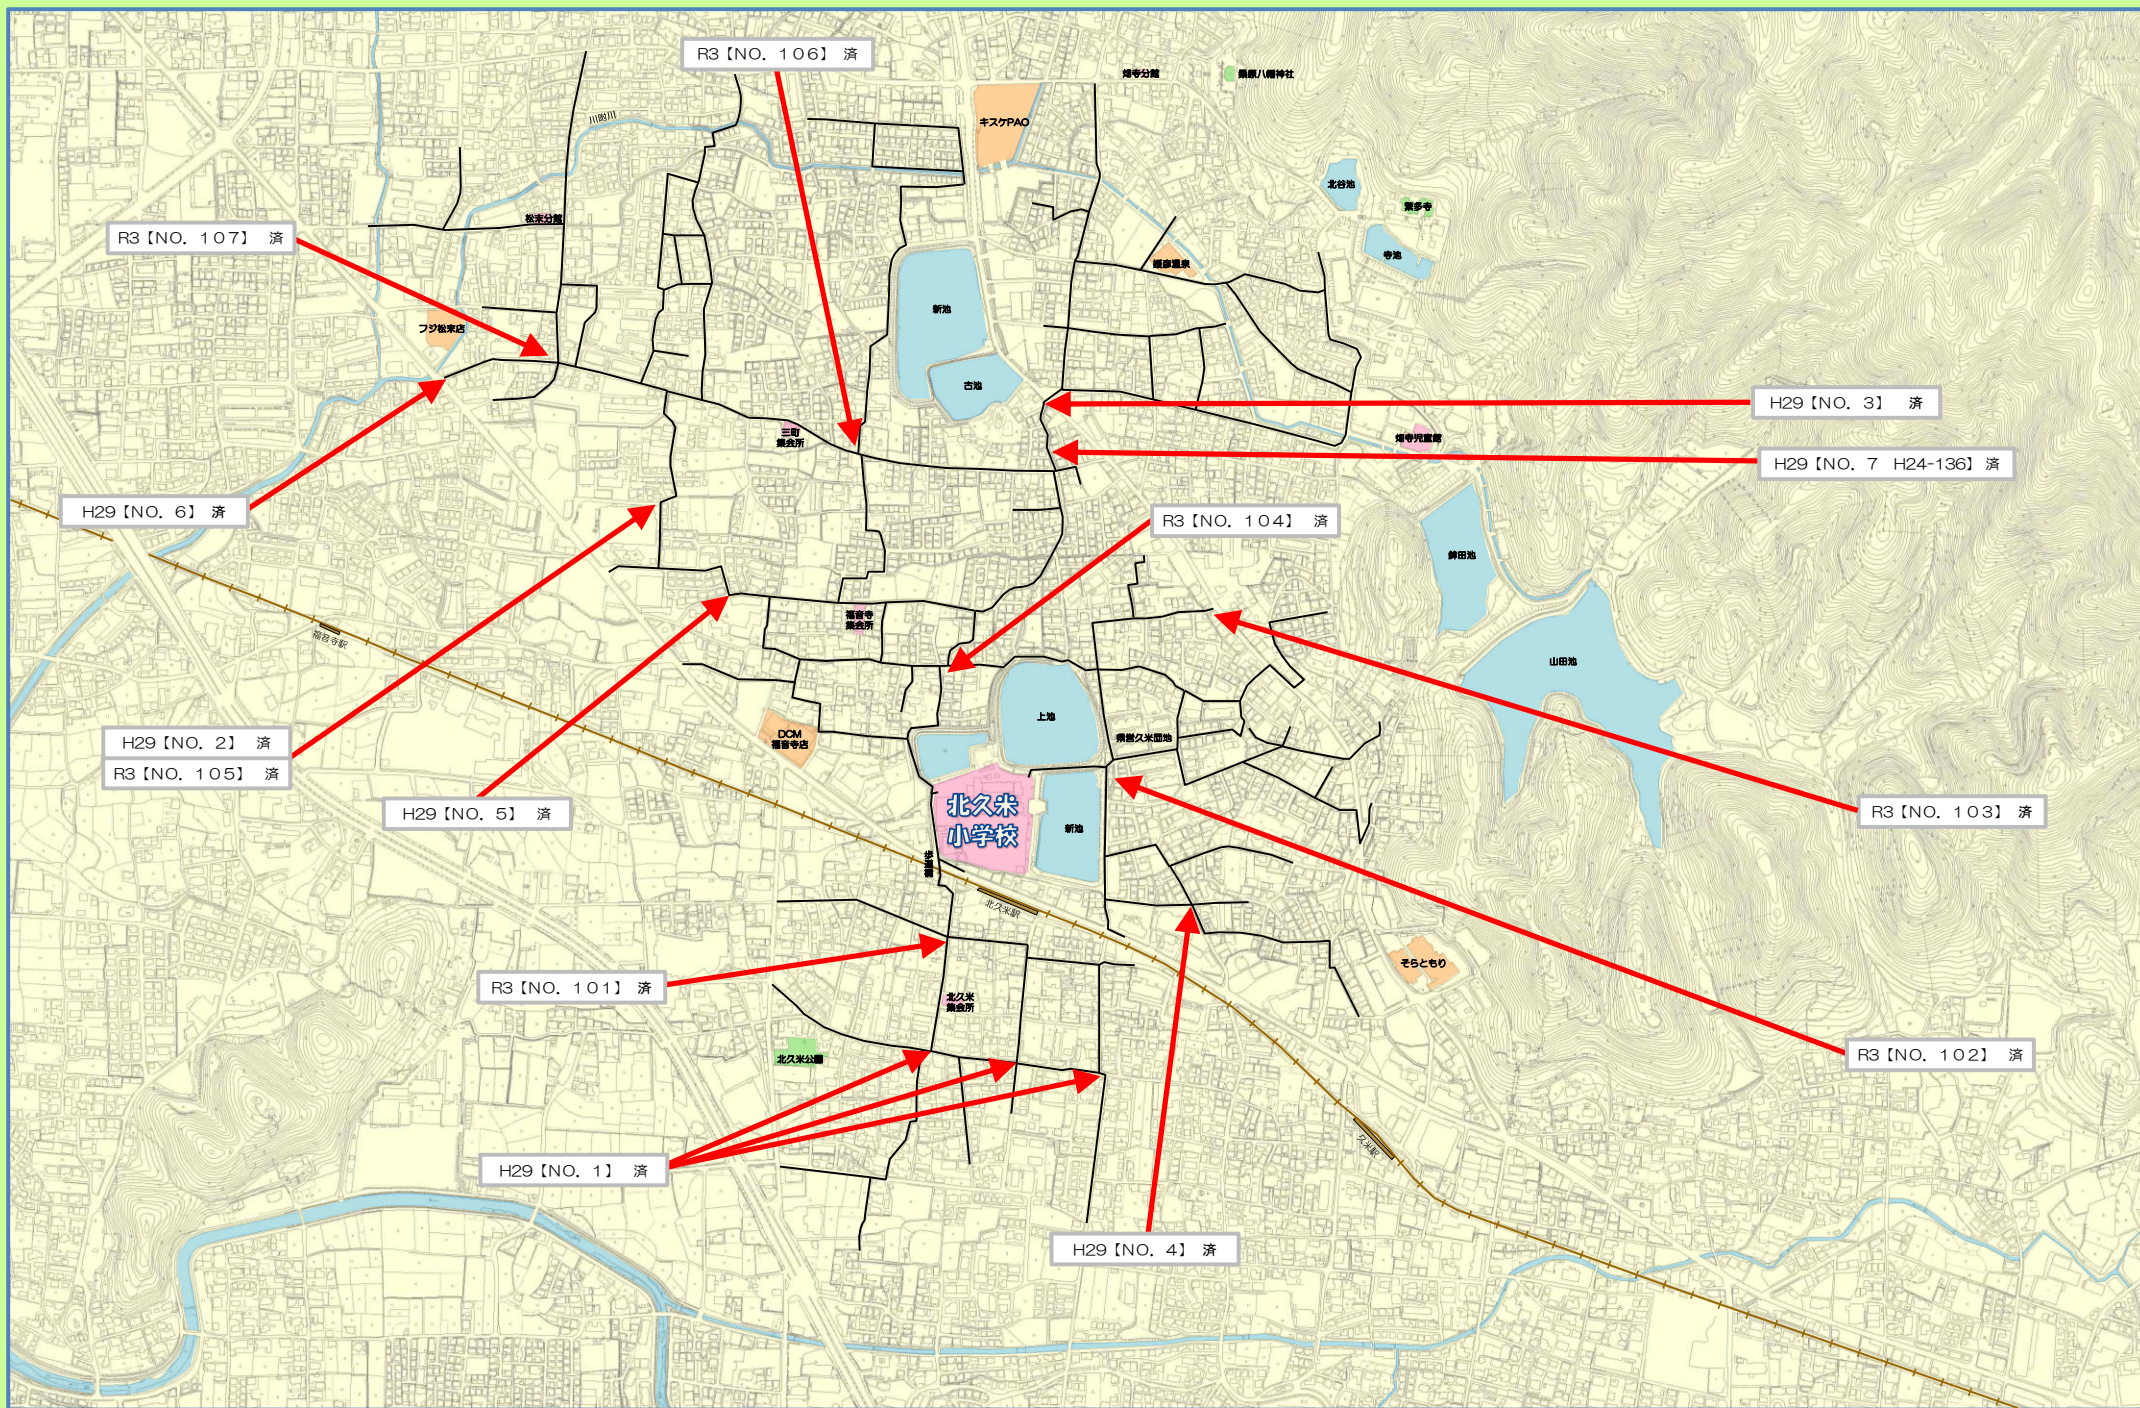

H29年度

H29【NO. 1】 済	H29【NO. 2】 済	H29【NO. 3】 済	H29【NO. 4】 済	H29【NO. 5】 済	H29【NO. 6】 済	H29【NO. 7 H24-136】 済
						
《状況》 見通しの悪い交差点で、車や自転車の通行量も多い箇所です。 《対策》 交差点マークを設置し、外側線の設置・引き直しをしました。	《状況》 狭い路地がありますが、気付きにくいため箇所です。 《対策》 交差点マークを設置しました。	《状況》 車の動線がわかりにくい交差点のため、車が交わる際に危険です。横断歩道や停止線も薄くなっています。 《対策》 ドット線・遮断帯を設置しました。 外側線・横断歩道・停止線を引き直しました。	《状況》 道幅が狭く見通しの悪い交差点であるため、注意が必要でです。 《対策》 ドット線を設置し、カーブミラーを調整しました。	《状況》 路側帯の幅が狭く、また外側線が薄くなっているため、注意が必要です。 《対策》 路側帯を拡張して外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。	《状況》 交通量の多い道路で、外側線など薄くなっています。 《対策》 横断歩道・停止線・外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。	《状況》 川沿いの道路から川に転落する恐れがあります。 《対策》 デリネーターを設置しました。

R3年度

R3【NO. 101】 済	R3【NO. 102】 済	R3【NO. 103】 済	R3【NO. 104】 済	R3【NO. 105】 済	R3【NO. 106】 済	R3【NO. 107】 済
						
《状況》 見通しが悪い道です。 《対策》 交差点マークを設置しました。	《状況》 道が狭く交通量が多いです。 《対策》 外側線を設置しました。	《状況》 横断歩道やその予告マークが薄くなっています。 《対策》 外側線を引き直しました。 停止線を引き直しました。 横断帯を設置しました。	《状況》 複雑な交差点で見通しが悪く、また、児童の通行も多いです。 《対策》 交差点マークを設置しました。	《状況》 車の速度が速く、児童の通行量も多いです。 《対策》 減速マークを設置しました。	《状況》 交通量が多く、車の速度が速いです。 《対策》 外側線を引き直しました。 30キロ規制の道路標示を設置しました。	《状況》 交通量が多いわりに道が狭く、見通しが悪いです。 《対策》 30キロ規制の道路標示を設置しました。
