


通学路合同点検対策箇所図（北久米小学校）

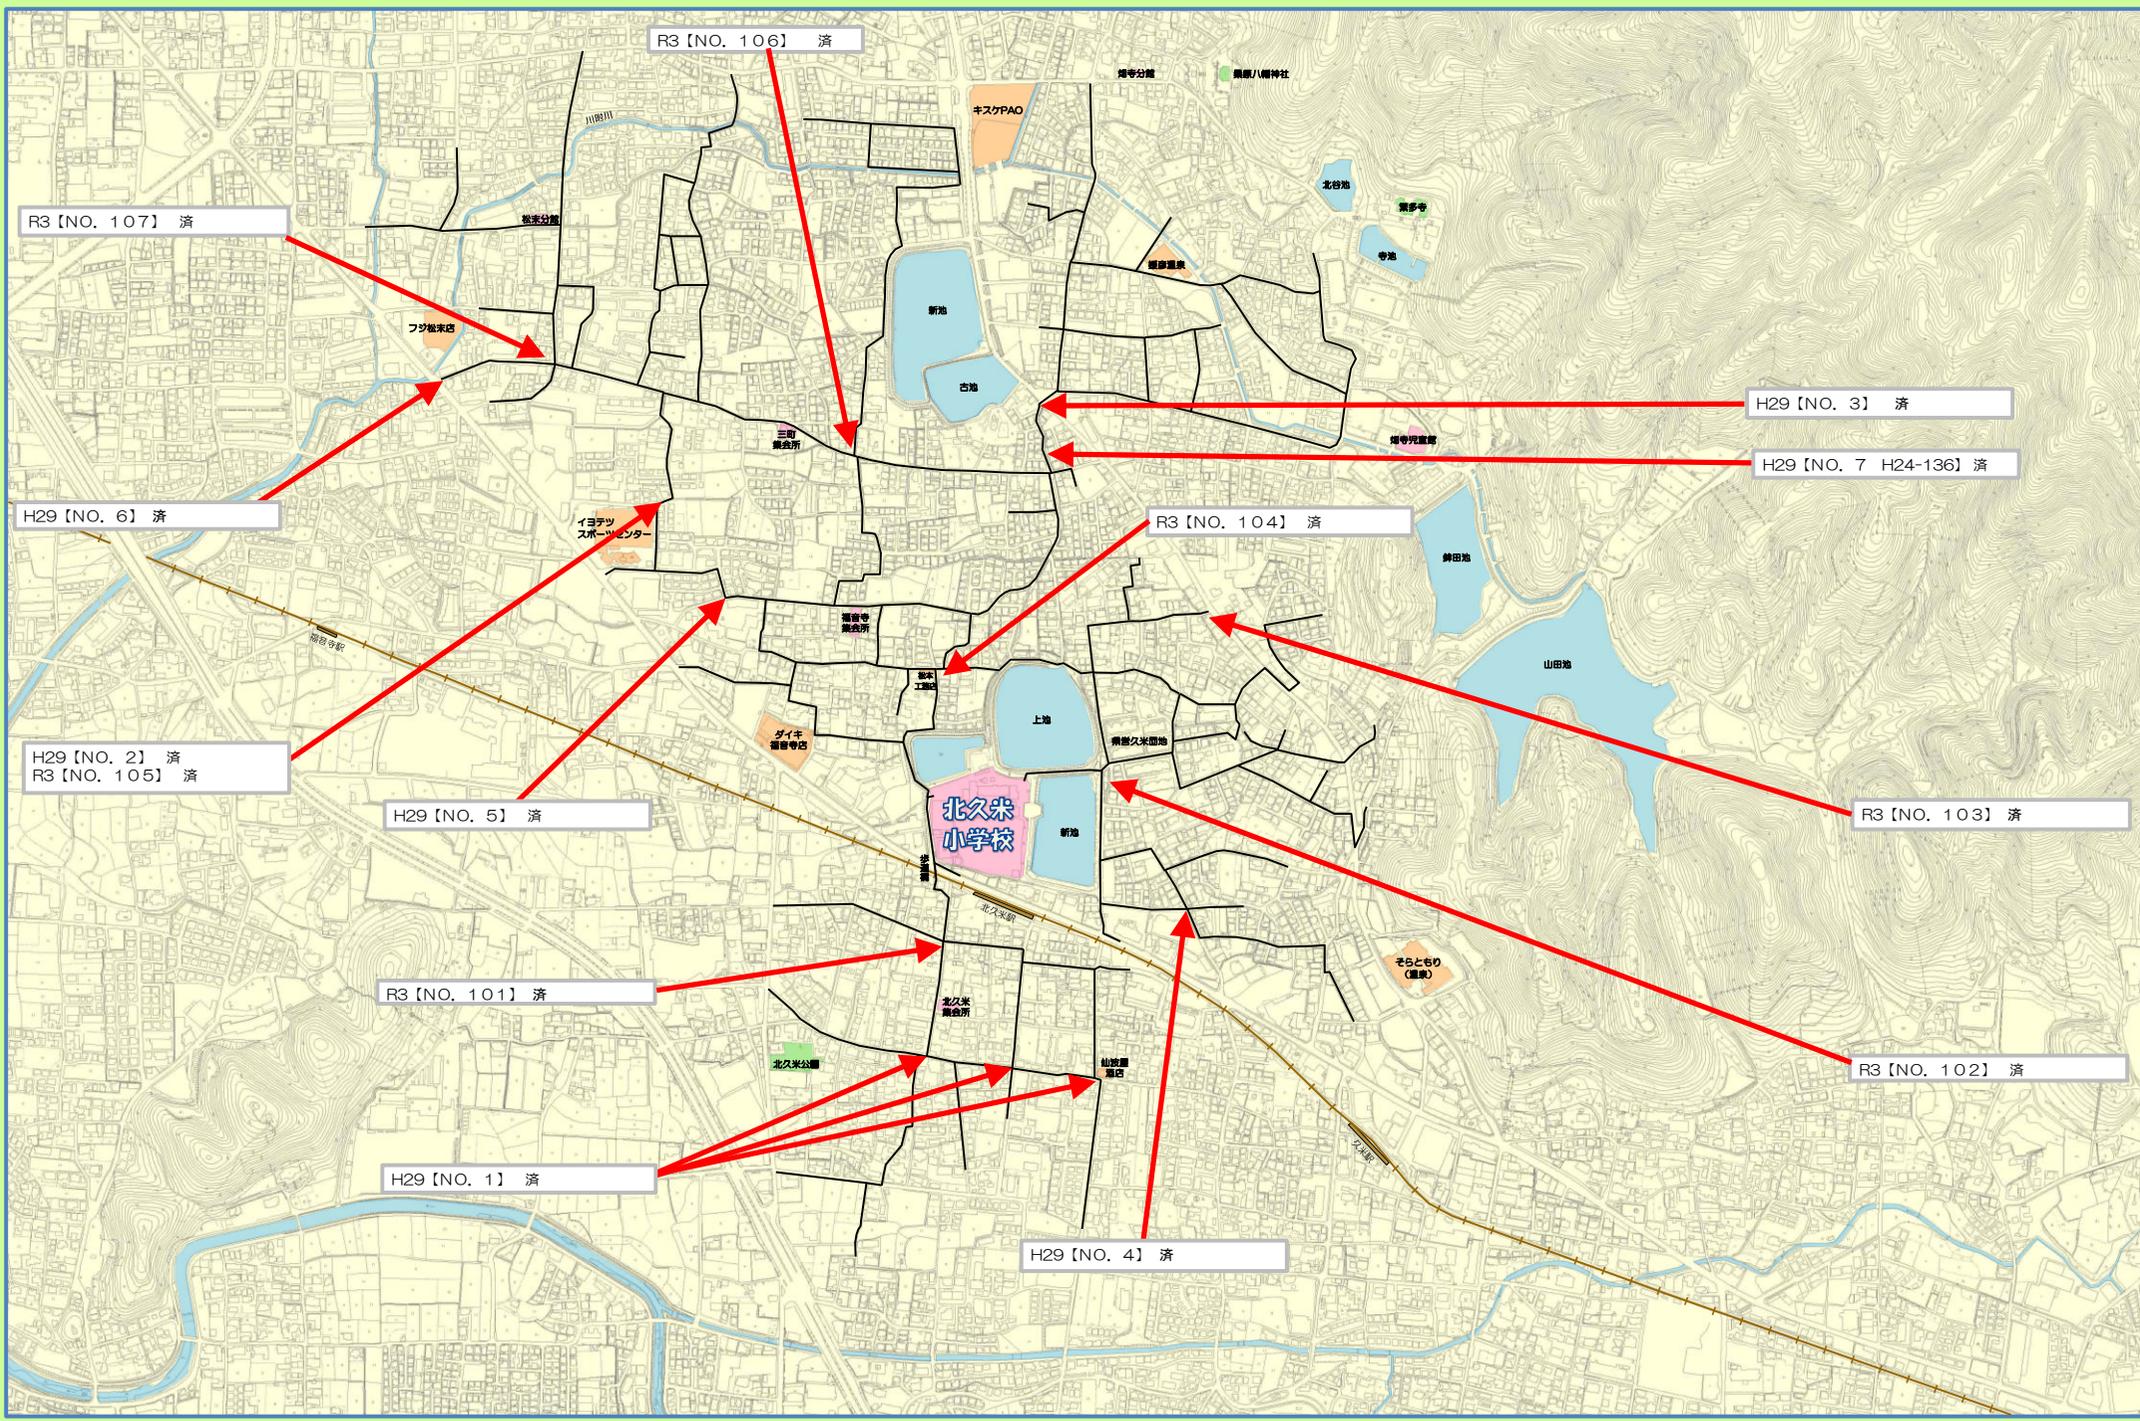

H29年度

<p>H29【NO. 1】 済</p>  <p>(状況) 見通しの悪い交差点で、車や自転車の通行量も多い箇所です。</p> <p>(対策) 交差点マークを設置し、外側線を設置・引き直しました。</p>	<p>H29【NO. 2】 済</p>  <p>(状況) 狭い路地がありますが、気付きにくいため箇所です。</p> <p>(対策) 交差点マークを設置しました。</p>	<p>H29【NO. 3】 済</p>  <p>(状況) 車の動線がわかりにくい交差点のため、車が変わる際に危険です。横断歩道や停止線も薄くなっています。</p> <p>(対策) ドット線・横断歩道を設置しました。 外側線・横断歩道・停止線を引き直しました。</p>	<p>H29【NO. 4】 済</p>  <p>(状況) 道幅が狭く見通しの悪い交差点であるため、注意が必要です。</p> <p>(対策) ドット線を設置し、カーブミラーを設置しました。</p>	<p>H29【NO. 5】 済</p>  <p>(状況) 路側帯の幅が狭く、また外側線が薄くなっているため、注意が必要です。</p> <p>(対策) 路側帯を拡張して外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。</p>	<p>H29【NO. 6】 済</p>  <p>(状況) 交通量の多い道路で、外側線など薄くなっています。</p> <p>(対策) 横断歩道・停止線・外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。</p>	<p>H29【NO. 7 H24-136】 済</p>  <p>(状況) 川沿いの道路から川に転落する恐れがあります。</p> <p>(対策) デリネーターを設置しました。</p>
---	---	--	--	---	---	---

R3年度

<p>R3【NO. 101】 済</p>  <p>(状況) 見通しが悪い道です。</p> <p>(対策) 交差点マークを設置しました。</p>	<p>R3【NO. 102】 済</p>  <p>(状況) 道が狭く交通量が多いです。</p> <p>(対策) 外側線を設置しました。</p>	<p>R3【NO. 103】 済</p>  <p>(状況) 横断歩道やその予告マークが薄くなっています。</p> <p>(対策) 外側線を引き直しました。 停止線を引き直しました。 横断歩道を設置しました。</p>	<p>R3【NO. 104】 済</p>  <p>(状況) 複雑な交差点で見通しが悪く、また、児童の通行も多いです。</p> <p>(対策) 交差点マークを設置しました。</p>	<p>R3【NO. 105】 済</p>  <p>(状況) 車の速度が速く、児童の通行量も多いです。</p> <p>(対策) 減速マークを設置しました。</p>	<p>R3【NO. 106】 済</p>  <p>(状況) 交通量が多く、車の速度が速いです。</p> <p>(対策) 外側線を引き直しました。 30キロ規制の道路標示を設置しました。</p>	<p>R3【NO. 107】 済</p>  <p>(状況) 交通量が多いわりに道が狭く、見通しが悪いです。</p> <p>(対策) 30キロ規制の道路標示を設置しました。</p>
--	--	--	---	---	---	--
