


通学路合同点検対策箇所図（難波小学校）



H29【NO. 1】 済

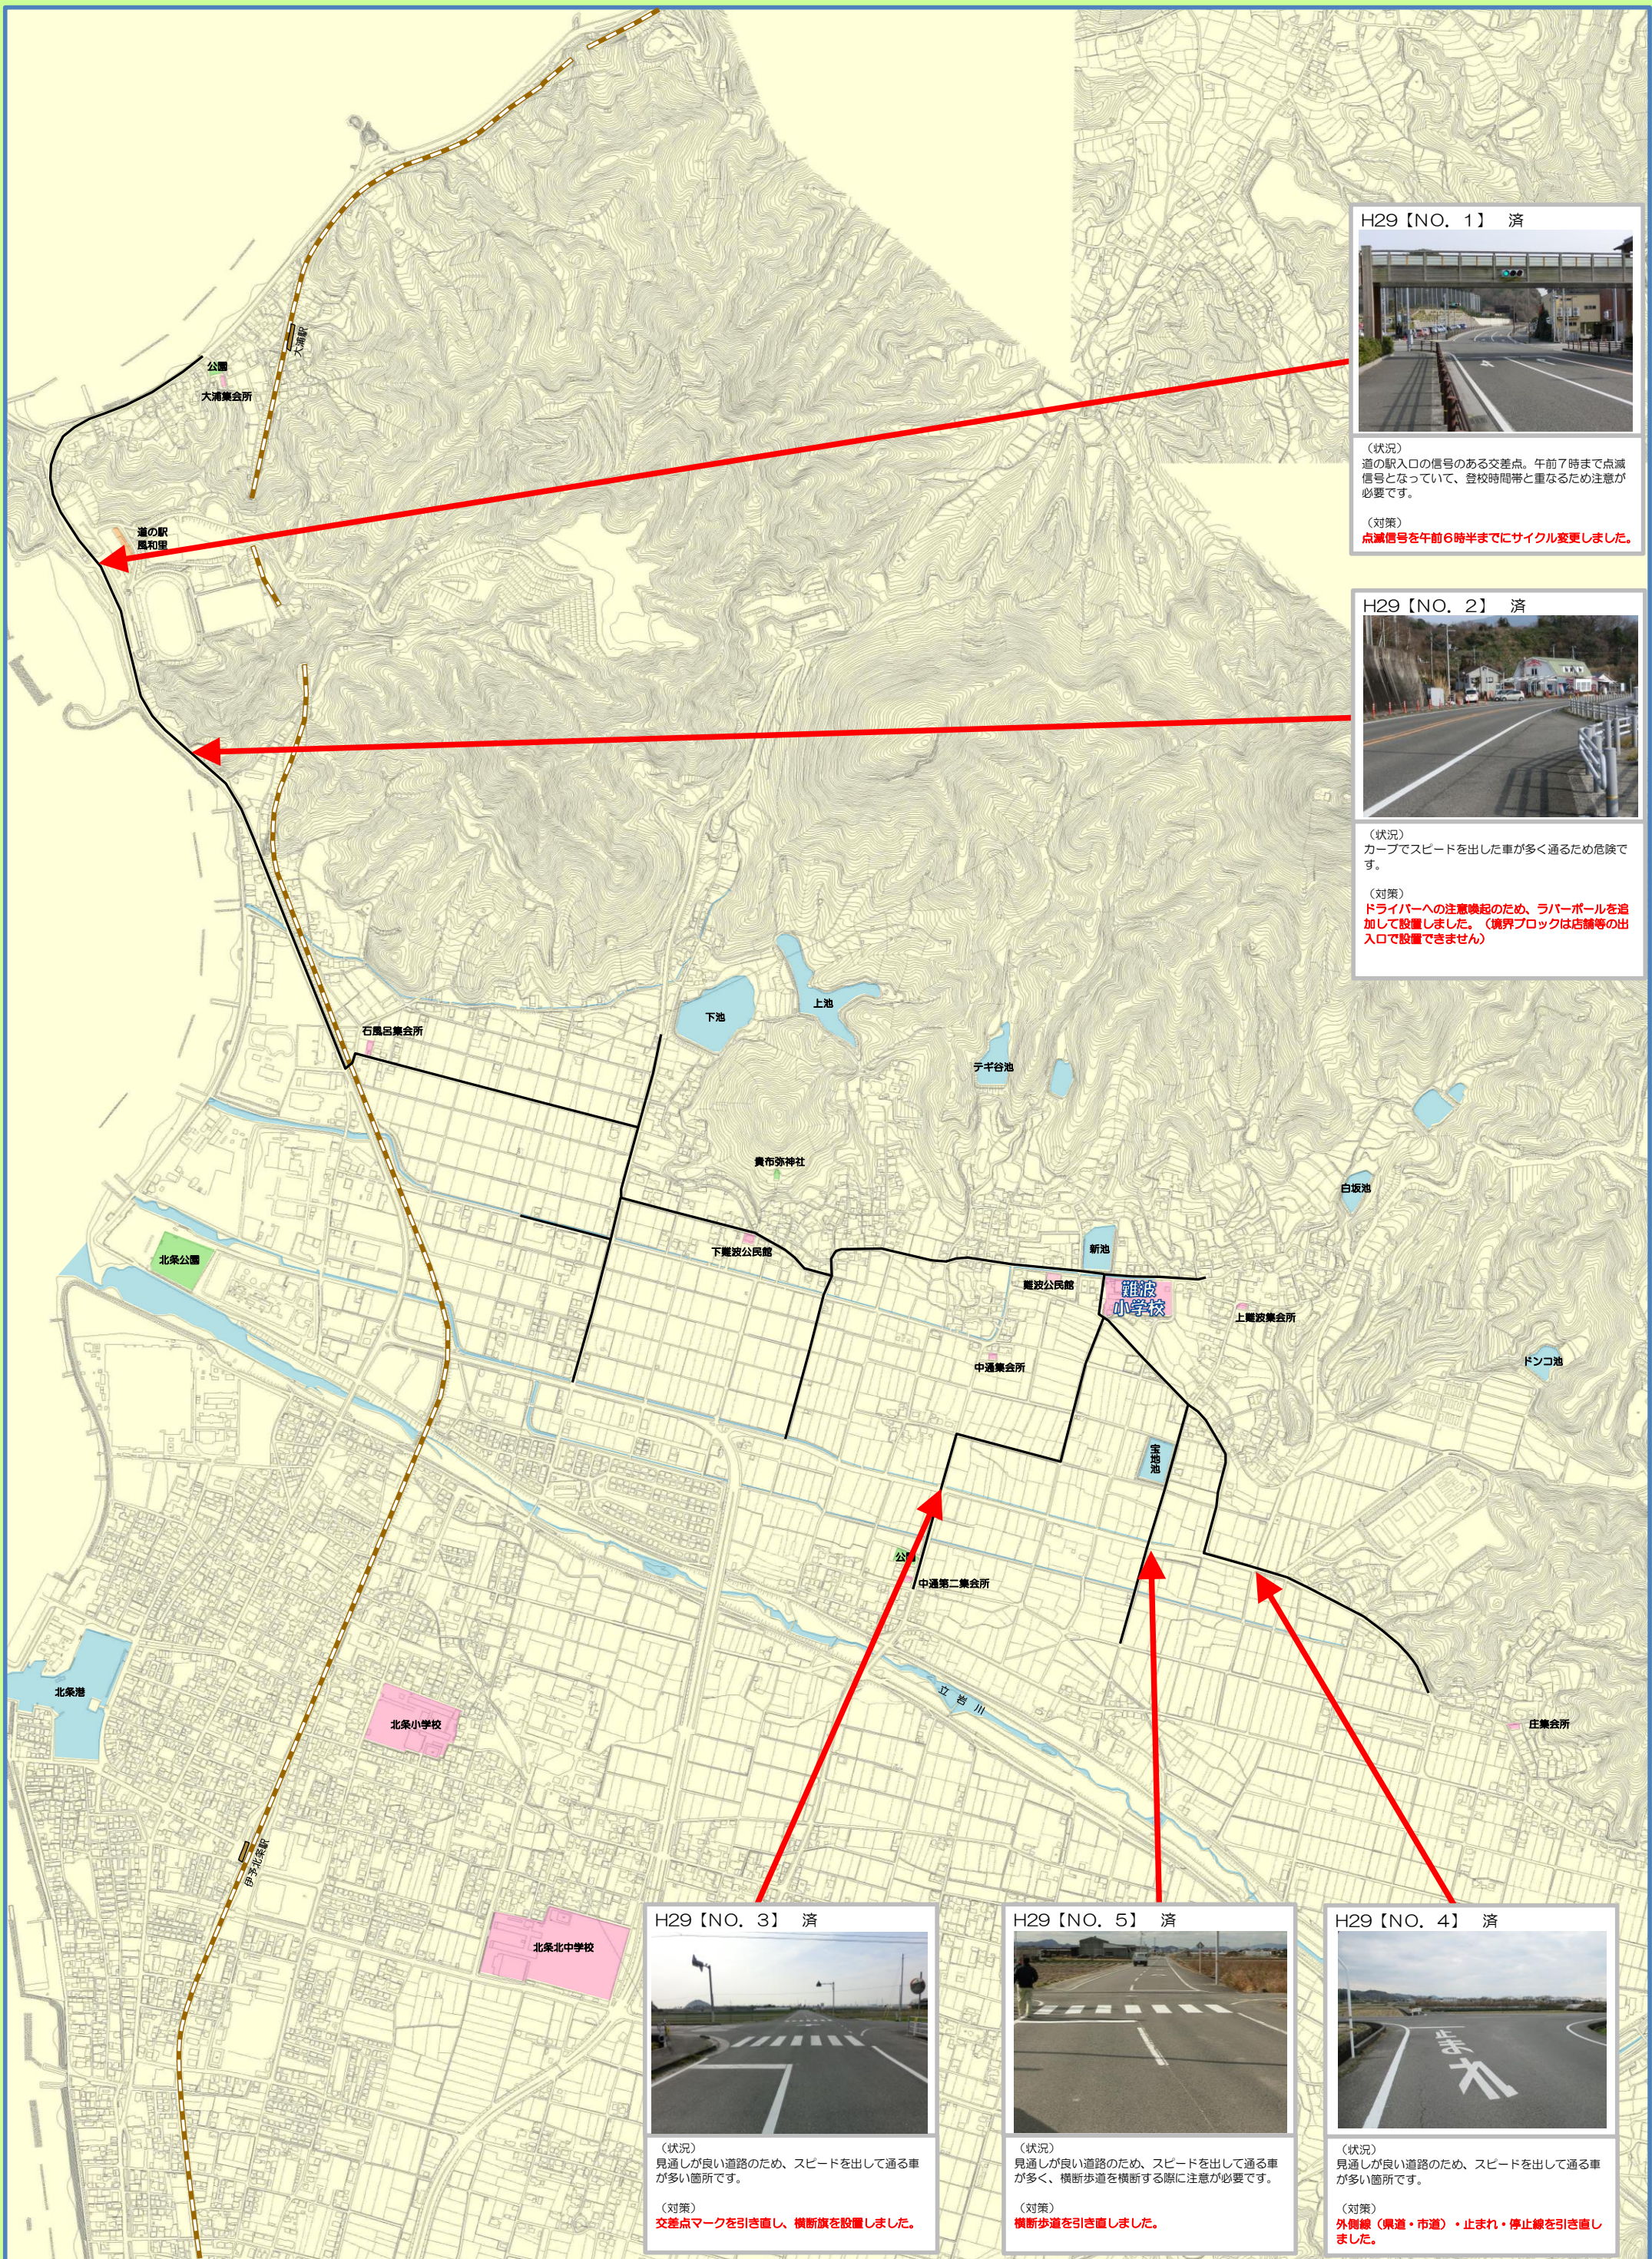

（状況）
道の駅入口の信号のある交差点。午前7時まで点滅信号となっていて、登校時間帯と重なるため注意が必要です。

（対策）
点滅信号を午前6時半までにサイクル変更しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）
カーブでスピードを出した車が多く通るため危険です。

（対策）
ドライバーへの注意喚起のため、ラバーポールを追加して設置しました。（境界ブロックは店舗等の出入口で設置できません）

H29【NO. 3】 済



（状況）
見通しが良い道路のため、スピードを出して通る車が多い箇所です。

（対策）
交差点マークを引き直し、横断旗を設置しました。

H29【NO. 5】 済



（状況）
見通しが良い道路のため、スピードを出して通る車が多く、横断歩道を横断する際に注意が必要です。

（対策）
横断歩道を引き直しました。

H29【NO. 4】 済



（状況）
見通しが良い道路のため、スピードを出して通る車が多い箇所です。

（対策）
外側線（県道・市道）・止まれ・停止線を引き直しました。
