


通学路合同点検対策箇所図（和気小学校）

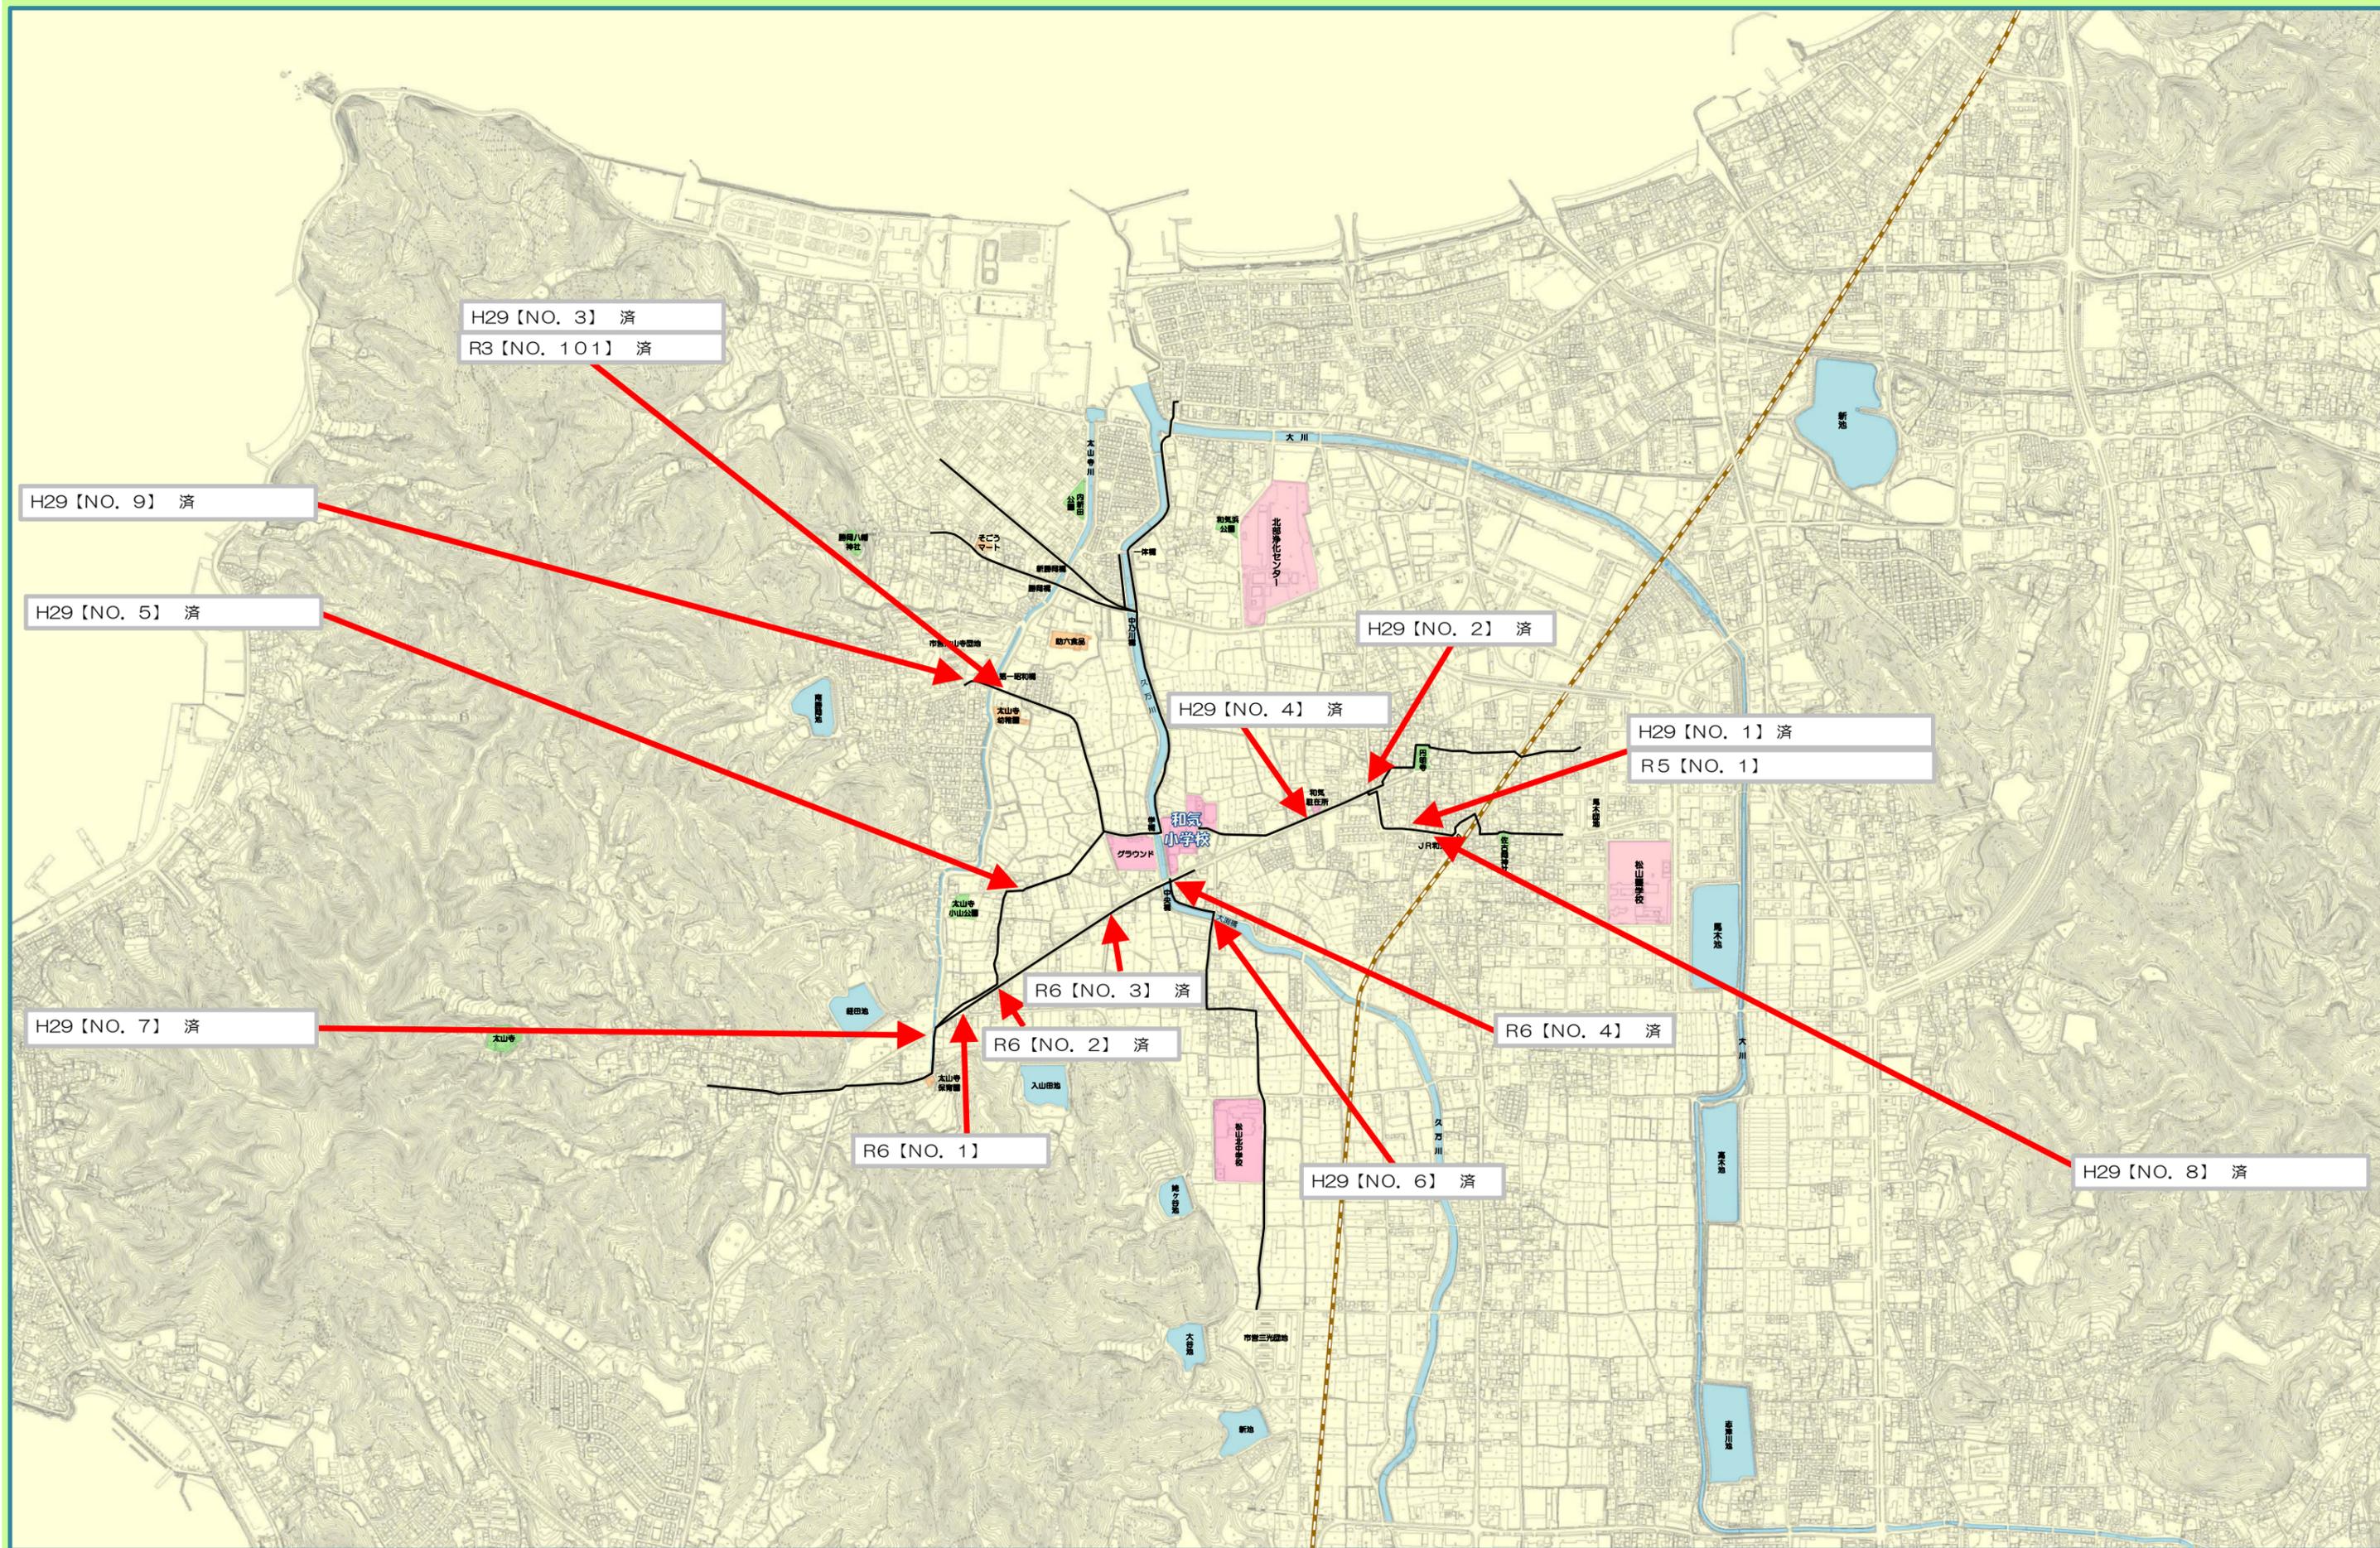

H29年度

<p>H29【NO. 1】 済</p>  <p>(状況) 交通量の多い交差点で、注意が必要な箇所です。</p> <p>(対策) カーブミラーを交換し、減速マークを設置しました。 横断歩道を引き直しました。</p>	<p>H29【NO. 2】 済</p>  <p>(状況) 横断歩道が薄くなっていて、横断時に注意が必要です。</p> <p>(対策) 横断歩道を引き直しました。</p>	<p>H29【NO. 3】 済</p>  <p>(状況) 外側線や横断歩道が薄くなっていて危険です。</p> <p>(対策) グリーンパルトを設置し、外側線を引き直しました。 横断歩道を引き直しました。</p>	<p>H29【NO. 4】 済</p>  <p>(状況) 見通しの悪い交差点で、横断時に注意が必要です。</p> <p>(対策) ドット線とカーブミラーを設置しました。</p>	<p>H29【NO. 5】 済</p>  <p>(状況) 見通しの悪い曲がり道で、注意が必要です。</p> <p>(対策) カーブミラーを設置しました。</p>	<p>H29【NO. 6】 済</p>  <p>(状況) 見通しの悪い交差点で、朝の車の通行量が多い箇所です。</p> <p>(対策) ドット線と路面に通学路の標示を設置しました。</p>	<p>H29【NO. 7】 済</p>  <p>(状況) 一部の区間で歩道が整備されていません。歩道が整備されれば、通学路として利用できます。</p> <p>(対策) 歩道を整備しました。</p>	<p>H29【NO. 8】 済</p>  <p>(状況) 見通しの悪い交差点で、危険です。</p> <p>(対策) 外側線を巻き込み、ドット線・交差点マークを設置しました。</p>
---	---	---	---	---	---	---	---

R3年度

R5年度

R6年度

<p>H29【NO. 9】 済</p>  <p>(状況) 交差点が複数ある箇所、横断時に注意が必要です。</p> <p>(対策) 交差点マークを設置しました。</p>	<p>R3【NO. 101】 済</p>  <p>(状況) 道路を通過する車が速度を出しています。</p> <p>(対策) 路肩の草刈りをしました。 路面に通学路マークを設置しました。</p>	<p>R5【NO. 1】</p>  <p>(状況) 見通しが悪く、南から北へ通り抜ける車が多いです。</p> <p>(対策) 錫製ポールと南側に減速マークを設置しました。 通学路上の交差点を南から北へ通過する交通量が減少することから東側にバイパス工事を予定しています。</p>	<p>R6【NO. 1】</p>  <p>(状況) 歩道が途切れており、車両の出入りがあることから危険です。</p> <p>(対策) ブロックを撤去し、ポールを設置しました。 横断歩道を設置する予定です。</p>	<p>R6【NO. 2】 済</p>  <p>(状況) 歩道が途切れており、車両の出入りがあることから危険です。</p> <p>(対策) グリーンパルトを設置しました。</p>	<p>R6【NO. 3】 済</p>  <p>(状況) 歩道が途切れており、車両の出入りがあることから危険です。</p> <p>(対策) グリーンパルトを設置しました。</p>	<p>R6【NO. 4】 済</p>  <p>(状況) 横断歩道を渡る際、川沿いの道路から侵入する車が信号の規制を受けられないため注意が必要です。</p> <p>(対策) グリーンパルトを設置しました。</p>
--	---	--	---	---	---	--
