


通学路合同点検対策箇所図（双葉小学校）



H29年度

H29【NO. 1 H24-165】 済

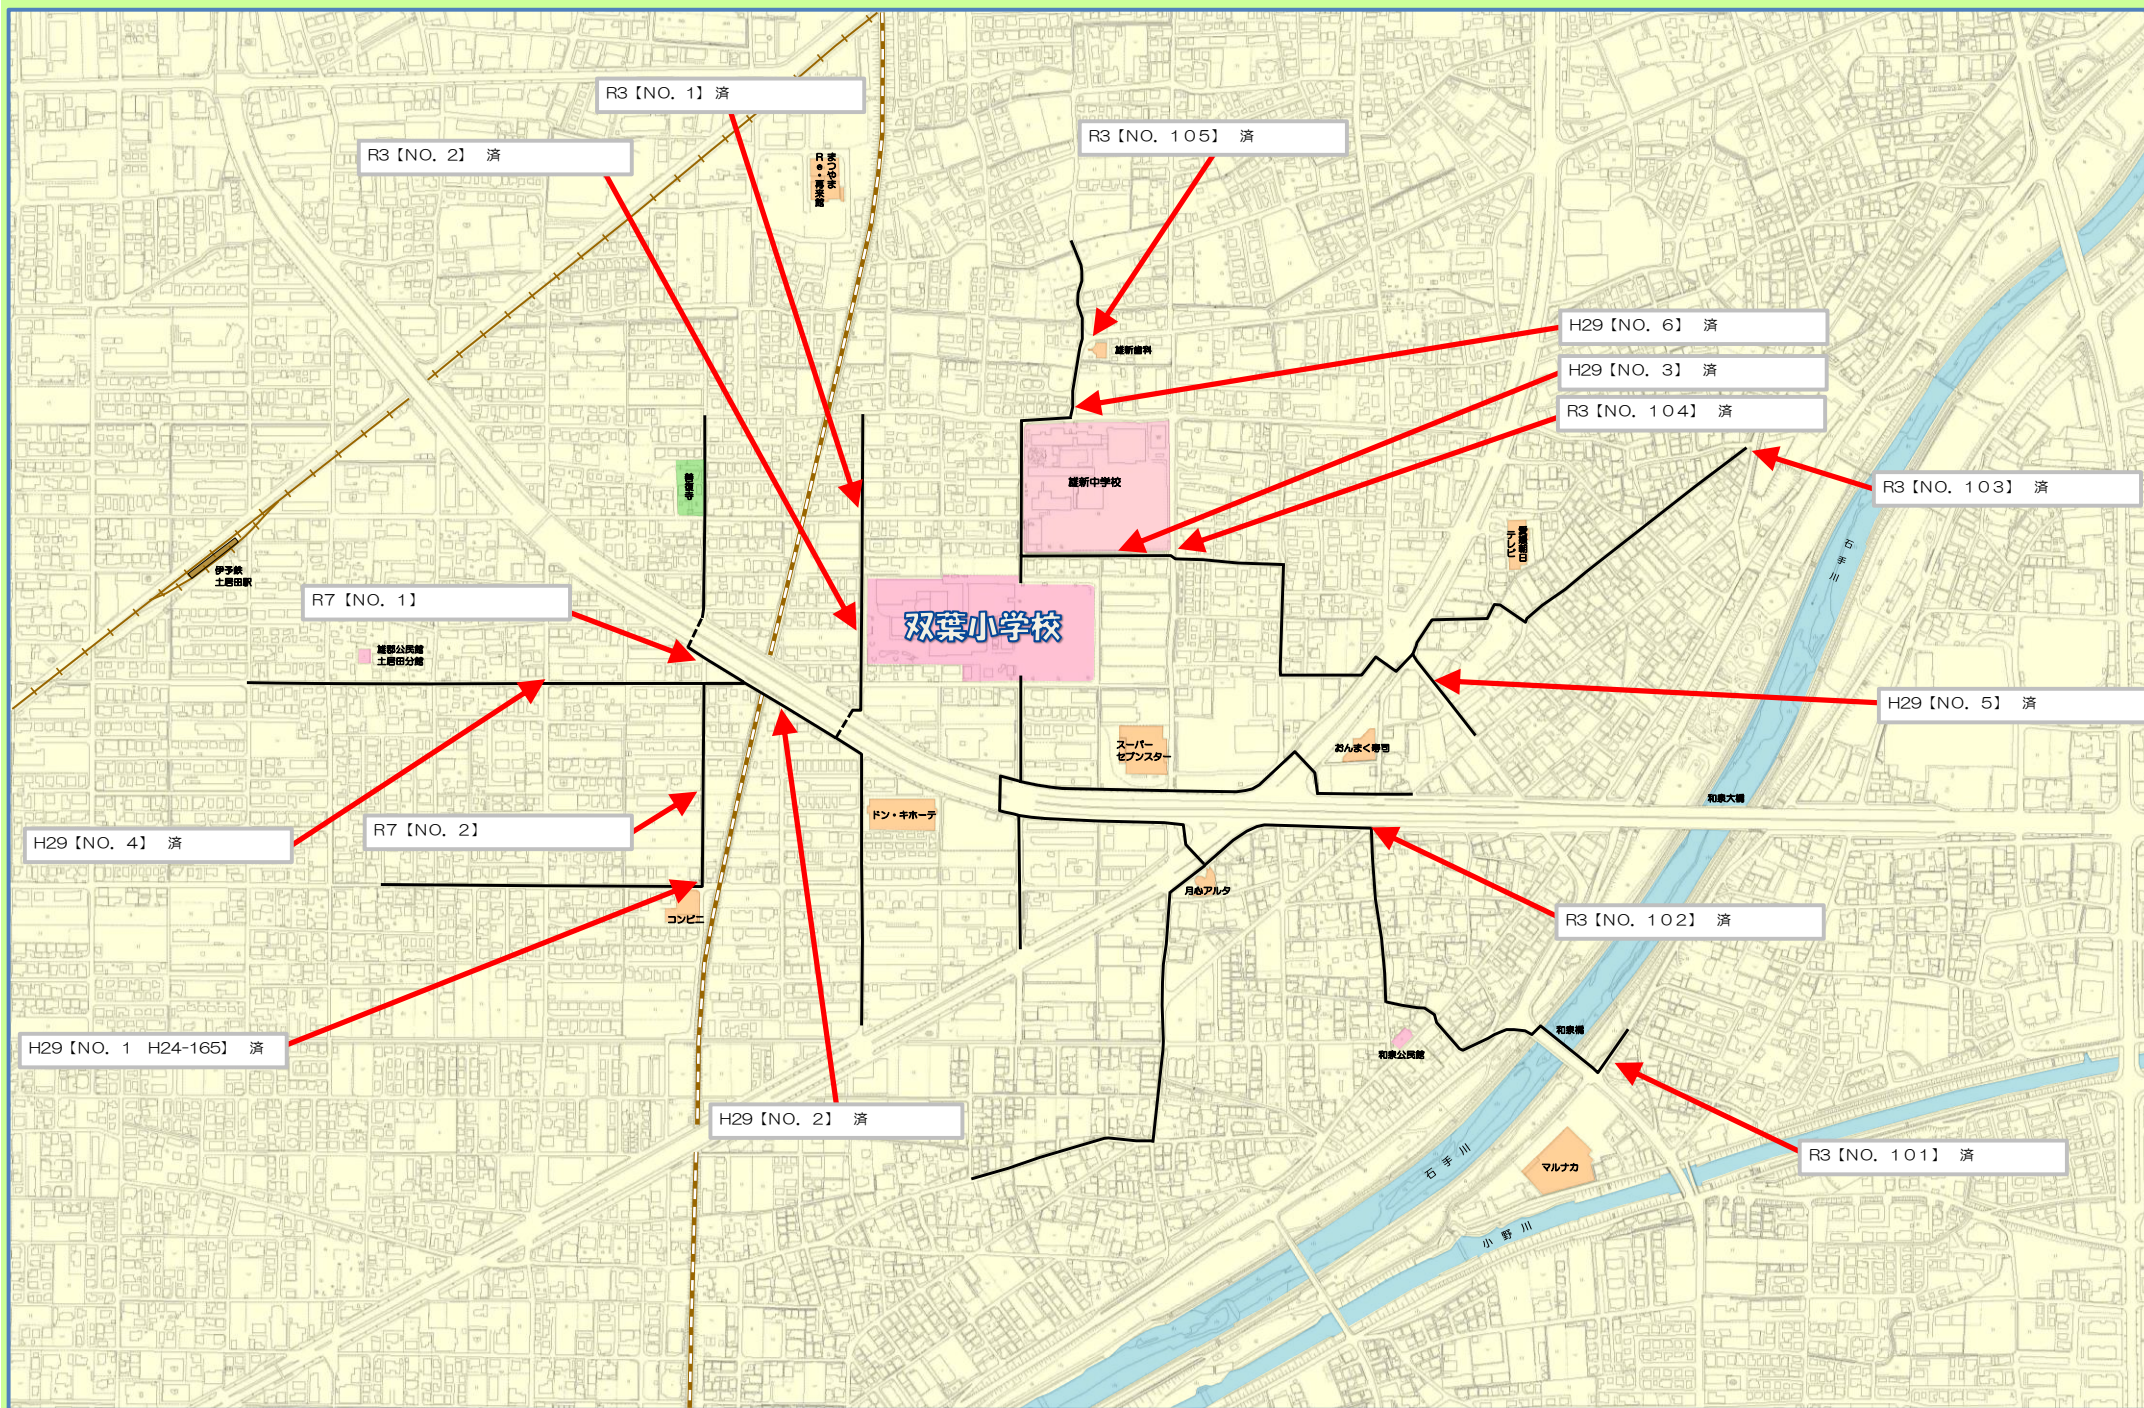

（状況）
交通量の多い交差点で注意が必要です。

（対策）
交差点マークとドット線を設置し、止まれを引き直しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）
歩道橋を下りた際、外側線がないため注意が必要です。

（対策）
外側線を設置しました。

H29【NO. 3】 済



（状況）
水路のある道路で、落下する危険があります。

（対策）
落下後とも水路の反対側を通るよう通学ルートを変更しました。グリーンベルト（水路の反対側）を設置しました。

H29【NO. 4】 済



（状況）
道幅が狭く交通量が多い交差点で、スピードも出した車も通行するため危険です。

（対策）
交差点マークとドット線を設置しました。停止線・止まれ・横断歩道を引き直しました。

H29【NO. 5】 済



（状況）
三叉路の交差点で、横断歩道など薄くなっています。

（対策）
外側線・横断歩道・停止線を引き直しました。

H29【NO. 6】 済



（状況）
外側線や横断歩道が薄くなっています。

（対策）
外側線と横断歩道を引き直しました。

R3【NO. 1】 済



（状況）
見通しが悪く、事故が多発しています。

（対策）
道路を補修し、交差点マークを引き直しました。横断歩道と東西に一時停止を設置しました。

R3【NO. 2】 済



（状況）
横断歩道や外側線が薄くなっています。

（対策）
道路を補修し、横断歩道・外側線を引き直しました。

R3年度

R3【NO. 101】 済



（状況）
土手を上がったところから、道幅が狭くなっています。

（対策）
グリーンベルトを設置しました。

R3【NO. 102】 済



（状況）
側道に入る車が入り込んで危険です。

（対策）
減速マークを設置しました。停止線を引き直しました。

R3【NO. 103】 済



（状況）
交通量が多いです。

（対策）
交差点マークを設置しました。

R3【NO. 104】 済



（状況）
横断歩道が弱えています。

（対策）
横断歩道を補修しました。

R3【NO. 105】 済



（状況）
スピードを出す車が多く、曲がる際に歩行者を巻き込みそうです。

（対策）
減速マークを設置しました。

R7【NO. 1】



（状況）
歩道が狭く注意が必要です。

（対策）
歩道の樹木を撤去し歩道の幅を広げる予定です。※令和12年度調完成予定。

R7【NO. 2】



（状況）
道幅が狭く水路もあり注意が必要です。

（対策）
水路を橋梁化し道路を拡幅する予定です。※令和12年度調完成予定。

R7年度
